



**COMUNE DI VADO LIGURE**

PROVINCIA DI SAVONA

## **DETERMINAZIONE**

**Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici**

N. LP/690/MA

N. 2498 Registro Generale

Data 01 dicembre 2025

---

**OGGETTO :**

**Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025 - Approvazione e affidamento maggiori lavori - Impegno della spesa.**

---

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI**

**VISTO** l'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

**VISTO** Il decreto sindacale n. 52 del 02/12/2024 di nomina dal 01/01/2025 al 31/12/2025 in qualità di Responsabile del Settore Lavori pubblici e servizi tecnologici, con attribuzione della relativa Posizione Organizzativa ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

**VISTA** La deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 30/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

**VISTO** che il Responsabile del progetto ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, articolo 15, è il Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici e Servizi tecnologici" con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, Arch. Felice Rocca;

**VISTO** che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Manutenzione, Geom. Alessandro Botta;

### **PREMESSO:**

- Che con comunicazione registrata al protocollo di questa Amministrazione al numero 14823 del 17/07/2025 la Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Settore Assetto del Territorio comunicava l'avvenuta approvazione del Programma annuale di interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo annualità 2024, disposta con Decreto Dirigenziale n° 5221 del 14/07/2025;
- Che con il suddetto Decreto Dirigenziale n° 5221 del 14/07/2025 veniva concesso al Comune di Vado Ligure l'importo di € 11.041,91 per gli interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo annualità 2025;
- Che il Comune di Vado Ligure ha intenzione di provvedere rapidamente alla consueta pulizia annuale dei corsi d'acqua in oggetto, mediante taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva cresciuta negli alvei;
- Che detta esigenza deriva dalla necessità di garantire il corretto deflusso idrico e di ripristinare le migliori condizioni igienico - sanitarie;

### **CONSIDERATO:**

- Che ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023 la stazione appaltante o l'ente

concedente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria può omettere il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

- Che il Servizio Manutenzione ha predisposto il progetto esecutivo denominato “Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2025” a firma del Geom. Alessandro Botta conservato agli atti del settore e registrato al protocollo dell’Ente al n° 16326 del 06/08/2025;
- CHE il progetto esecutivo – esecutivo è composto dai seguenti elaborati:
  - Relazione illustrativa
  - Planimetrie su carta tecnica regionale
  - Planimetrie su base catastale
  - Documentazione fotografica
  - Elenco dei prezzi unitari
  - Computo metrico estimativo
  - Quadro economico
  - Documento contenente indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
  - Cronoprogramma
  - Capitolato speciale di appalto
  - Lista delle lavorazioni previste per l’esecuzione dei lavori
- CHE il progetto prevede la spesa complessiva di € 112.000,00, con il seguente quadro economico complessivo:

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	PROGETTO	
Per lavori a misura	€ 3.012,00	
Per lavori a corpo	€ 85.700,00	
Sommano		€ 88.712,00
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A corpo	€ 1.387,32	
Sommano		€ 1.387,32
Importo contrattuale netto		€ 90.099,32
c) Somme a disposizione della stazione appaltante		
Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 1.801,99	
IVA ed altre eventuali imposte	€ 19.821,85	
Contribuzione ANAC	€ 35,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 241,84	
Sommano		€ 21.900,68
Importo complessivo dell'intervento		€ 112.000,00

#### **PRESO ATTO:**

- Dei verbali di verifica e validazione del progetto assunti al n° 16357 di protocollo in data 06/08/2025 a firma dell’Arch. Felice Rocca;
- Che con Deliberazione della G.C. n° 92 del 12/08/2025 è stato approvato il progetto in parola;

#### **VISTO:**

- L’articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 che definisce che la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici è fissata in € 5.538.000,00 per lavori, ed in € 221.000,00 per servizi e forniture e che il calcolo del valore stimato è basato sul totale

massimo pagabile, al netto dell’IVA.

- L’articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, che prevede che le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;

#### CONSIDERATO:

- Che la richiesta di preventivi per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stata espletata mediante richiesta di offerta RdO n. **5580621** in data 25/08/2025 in via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), con il criterio del prezzo più basso;
- Che al termine per la presentazione dei preventivi sono state presentate le seguenti offerte:
  - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT ..... 21,000%
  - ECOGRID S.R.L. ....20,880%
  - AGRIFOREST SNC DI RIGHELLO MASSIMO & C. ....Non ha presentato offerta
- Che con Determinazione del Capo Settore 4° n° 509 del 05/09/2025 RG n° 1808 si è provveduto ad affidare i lavori in oggetto all’O.E. **SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORIELLI**, Via Carpenaro 15A MIOGLIA (SV) - C.F./P.IVA 01174200095, a fronte del ribasso percentuale offerto 21,000%, corrispondente all’importo per lavori pari a netti € 70.082,60, oltre oneri per la sicurezza € 1.387,32, per complessivi € **71.469,92** IVA esclusa;
- Che il quadro economico di contratto, è articolato nel modo seguente:

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	CONTRATTO	
Per lavori a misura	€ 3.012,00	
Per lavori a corpo	€ 85.700,00	
Sommano		€ 88.712,00
A dedurre il ribasso d'asta del 21,00%	€ 18.629,40	
Restano		€ 70.082,60
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A corpo	€ 1.387,32	
Sommano		€ 1.387,32
Importo contrattuale netto		€ 71.469,92
c) Somme a disposizione della stazione appaltante		
Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 1.801,99	
IVA ed altre eventuali imposte	€ 15.723,38	
Contribuzione ANAC	€ 35,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 22.969,71	
Sommano		€ 40.530,08
Importo complessivo dell'intervento		€ 112.000,00

#### VISTO:

- Che in data 15/09/2025 sono stati consegnati i lavori in oggetto;
- Che in data 30/10/2025 sono stati sospesi per la redazione della perizia per la modifica

del contratto di che trattasi;

- Che il disciplinare di gara prevede all'articolo 1.4.13 la seguente clausola: "In particolare il contratto potrà essere modificato in diminuzione senza limiti di valore monetario nel rispetto di quanto previsto dal Codice, articolo 120, comma 1, lettera a). L'amministrazione si riserva inoltre di far eseguire maggiori interventi fino alla concorrenza dell'intero importo a base di gara, estendendo anche ai lavori aggiuntivi il medesimo ribasso offerto in sede di gara.";
- Che il direttore dei lavori ha redatto una perizia per maggiori lavori, allegata al presente atto, composta dai seguenti elaborati:
  - 1) Relazione illustrativa
  - 2) Planimetrie su base CTR
  - 3) Elenco prezzi - prezzi di contratto
  - 4) Computo metrico estimativo – prezzi di contratto
  - 5) Quadro comparativo
  - 6) Atto di sottomissione
- Che il quadro economico di contratto della suddetta perizia per maggiori lavori, è il seguente:

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	MAGGIORI LAVORI	
Per lavori a misura	€ 15.258,00	
Per lavori a corpo	€ 96.800,00	
Sommano		€ 112.058,00
A dedurre il ribasso d'asta del 21,00%	€ 23.532,90	
Restano		€ 88.525,10
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A corpo	€ 1.387,32	
Sommano		€ 1.387,32
Importo contrattuale netto		€ 89.912,42
c) Somme a disposizione della stazione appaltante		
Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 2.268,91	
IVA ed altre eventuali imposte	€ 19.780,73	
Contribuzione ANAC	€ 35,00	
Eventuali maggiori lavori ordinabili come previsto dal capitolato speciale di appalto, par. 1.1.2 (incluso incremento accantonamento decreto legislativo 50/2016, articolo 113 ed IVA)	€ 0,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2,94	
Sommano		€ 22.087,58
Importo complessivo dell'intervento		€ 112.000,00

- Che in conseguenza dell'aumento dell'importo dei lavori deve essere incrementato anche l'accantonamento di cui al D.Lgs. 36/2023, articolo 45;
- Che l'impresa esecutrice del contratto principale ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 21/11/2025 e che lo stesso è impegnativo per l'assuntore fin dal momento della sottoscrizione, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo il perfezionamento del

presente atto;

- Che l'ufficio di Direzione dei lavori è composto nel modo seguente:
  - Geom. Alessandro Botta, direttore dei lavori
  - Geom. Davide Figoni, direttore operativo;
- Che il presente affidamento è contraddistinto dai seguenti codici:
  - CIG: **B824778256**
  - CPV: 45246200-5 Lavori di protezione delle sponde

#### **RITENUTO:**

- Che sia meritevole di approvazione la perizia per maggiori lavori redatta dal direttore dei lavori Geom. Alessandro Botta per la modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 120, comma 1, lettera a);
- Che occorra provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa a favore dell'operatore economico **SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORIELLI**, per un importo di € 18.442,50 oltre € 4.057,35 per IVA al 22% così per complessivi **€ 22.499,85**;
- Di stanziare la suddetta somma di **€ 22.499,85** (IVA inclusa), come di seguito descritto:
  - **€ 6.576,62** mediante trasformazione in impegno della **Prenotazione "25/33** di cui al Capitolo 4330/30 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE VOLTI AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO, TUTELA IGIENICO SANITARIA, SVILUPPO SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (CAP. E 3155/0)" (Missione 09 – Progetto 02 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
  - **€ 15.923,23** mediante trasformazione in impegno di parte della **Prenotazione "25/34** di cui al Capitolo 1270/26 "SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO PARTE CORRENTE FIN\_ 46)" (Missione 01 – Progetto 05 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin° V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
- Che occorra integrare dell'importo di **€ 466,92** il fondo previsto dal D.Lgs. 36/2023, articolo 45, così suddiviso: **€ 373,54** da destinare a fondo incentivante ed **€ 93,38** da destinare a innovazione tecnologica, come di seguito descritto:
  - **€ 373,54** mediante trasformazione in impegno di parte della **Prenotazione "25/34** di cui al Capitolo 1270/26 "SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO PARTE CORRENTE FIN\_ 46)" (Missione 01 – Progetto 05 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin° V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
  - **€ 93,38** mediante trasformazione in impegno di parte della **Prenotazione "25/34** di cui al Capitolo 1270/26 "SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO PARTE CORRENTE FIN\_ 46)" (Missione 01 – Progetto 05 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin° V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
- Di demandare a successivo atto l'approvazione della scheda di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche e l'assunzione dell'impegno a favore dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche connesse all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal

decreto legislativo 36/2023, articolo 45;

#### DATO ATTO:

- Che si procederà alla liquidazione delle somme a favore della Società incaricata a fronte di regolari fatture, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Che è stato acquisito il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'operatore economico **SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORIELLI** conservato agli atti del settore, da cui si evince il possesso di parte dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023;
- Che è stato acquisito il DURC on Line relativo all'operatore economico (Numero Protocollo INAIL\_51849638 Data richiesta 26/11/2025 Scadenza validità 26/03/2026), conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;
- Che l'operatore economico **SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORIELLI** risulta iscritto alla "White List" della Prefettura di Savona;

#### RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo 267 articolo 183 del 18 agosto 2000 – "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare il comma 8 dell'articolo 183 del decreto legislativo n.267/2000-TUEL, in base al quale il funzionario deve dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della legge n.208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n° 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Il "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" vigente.
- Il "Regolamento di Contabilità" vigente;

### D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che il presente affidamento è contraddistinto dai seguenti codici:
  - CIG: **B824778256**
  - CPV: 45246200-5 Lavori di protezione delle sponde
- 2) Di approvare la perizia per la modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 36/2016 art. 120, comma 1, lettera a), allegata al presente atto, redatta dal direttore dei lavori Geom. Alessandro Botta, già sottoscritta dall'esecutore in data 21/11/2025, in segno di accettazione, che comporta il seguente quadro economico di contratto:

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	MAGGIORI LAVORI	
Per lavori a misura	€ 15.258,00	
Per lavori a corpo	€ 96.800,00	
Sommano		€ 112.058,00
A dedurre il ribasso d'asta del 21,00%	€ 23.532,90	
Restano		€ 88.525,10
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A corpo	€ 1.387,32	

Sommano		€ 1.387,32
Importo contrattuale netto		€ 89.912,42
c) Somme a disposizione della stazione appaltante		
Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 2.268,91	
IVA ed altre eventuali imposte	€ 19.780,73	
Contribuzione ANAC	€ 35,00	
Eventuali maggiori lavori ordinabili come previsto dal capitolato speciale di appalto, par. 1.1.2 (incluso incremento accantonamento decreto legislativo 50/2016, articolo 113 ed IVA)	€ 0,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2,94	
Sommano		€ 22.087,58
Importo complessivo dell'intervento		€ 112.000,00

- 3) Di prendere atto che l'O.E. affidatario **SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORIELLI**, Via Carpenaro 15A MIOGLIA (SV) - C.F./P.IVA 01174200095, ha sottoscritto l'atto diottomissione in data 02/12/2024 e che lo stesso è impegnativo per l'assuntore fin dal momento della sottoscrizione, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo il perfezionamento del presente atto;
- 4) Di impegnare a favore dell'O.E. **SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORIELLI**, che ha offerto il ribasso percentuale del 21,000%, la somma di € 18.442,50 oltre € 4.057,35 per IVA al 22% così per complessivi **€ 22.499,85**, dando atto che la medesima somma trova copertura finanziaria nel modo seguente:
- **€ 6.576,62** mediante trasformazione in impegno della **Prenotazione "25/33** di cui al Capitolo 4330/30 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE VOLTI AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO, TUTELA IGIENICO SANITARIA, SVILUPPO SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (CAP. E 3155/o)" (Missione 09 – Progetto 02 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
  - **€ 15.923,23** mediante trasformazione in impegno di parte della **Prenotazione "25/34** di cui al Capitolo 1270/26 "SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO PARTE CORRENTE FIN\_ 46)" (Missione 01 – Progetto 05 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin° V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
- 5) Di impegnare la somma di **€ 466,92** per la costituzione del fondo previsto dal D.Lgs. 36/2023, articolo 45, dando atto che la stessa trova copertura nel modo seguente:
- ⇒ **Quota da destinare a fondo incentivante € 373,54** mediante trasformazione in impegno di parte della **Prenotazione "25/34** di cui al Capitolo 1270/26 "SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO PARTE CORRENTE FIN\_ 46)" (Missione 01 – Progetto 05 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin° V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;



⇒ **Quota da destinare a innovazione tecnologica € 93.38** mediante trasformazione in impegno di parte della **Prenotazione “25/34** di cui al Capitolo 1270/26 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO\_PARTE CORRENTE FIN\_ 46)” (Missione 01 – Progetto 05 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin° V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;

- 6) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2025;
- 7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, articolo 15, è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Arch. Felice Rocca.
- 8) Di attestare che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 9) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni 8DCC n° 5 del 26/02/2013).
--

**IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici**

**Data 01 dicembre 2025**

**( ROCCA ARCH. FELICE ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**COMUNE DI VADO LIGURE**

PROVINCIA DI SAVONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**

**N. Determina Registro Generale 2498 Data 01/12/2025**

---

**OGGETTO :**

**Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025 - Approvazione e affidamento maggiori lavori - Impegno della spesa.**

VISTO AI SENSI DELL’ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- [x] assunzione dell’impegno di spesa
- [ ] riduzione di spesa
- [ ] economia di spesa
- [ ] integrazione di spesa
- [ ] annullamento di spesa
- [ ] prenotazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL’ART. 184 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- [ ] liquidazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL’ART. 179 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- [ ] accertamento di entrata
- [ ] integrazione di entrata
- [ ] riduzione di entrata
- [ ] annullamento di entrata

Impegno			Accertamento											
Anno/Numero			Anno/Numero		Cap.		Art.	Descrizione del Capitolo	Cod.Bil.		Importo	P.Fin.	CUP	CIG
2025	2382	0				4330	30	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VOLTI AL	09 02 1 103	Impegno	6.576,62	U.1.03.02.09.008		B82477
						1270	26	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL						
						1270	26	TERRITORIO, TUTELA IGIENICO						
						1270	26	SANITARIA, SVILUPPO SISTEMI DI						
								MONITORAGGIO AMBIENTALE E						
								GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (CAP.						
								E 3155/0)						
								SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E						
2025	2383	0					DEMANIO (ONERI DISCARICA	01 05 1 103	Impegno	15.923,23			8256	
2025	2384	0					BOSSARINO PARTE CORRENTE FIN_ 46)	01 05 1 103	Impegno	373,54			8256	
2025	2385	0					SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E	01 05 1 103	Impegno	93,38			8256	
							DEMANIO (ONERI DISCARICA							
							BOSSARINO PARTE CORRENTE FIN_ 46)							
							SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E							
							DEMANIO (ONERI DISCARICA							
							BOSSARINO PARTE CORRENTE FIN_ 46)							

**Vado Ligure, li 02/12/2025**

**IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO ad interim  
(POLIFRONI ANNA MARIA) \***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



## COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI**

### **Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2025.**

#### **Modifica del contratto**

(D.Lgs. 36/2023, articolo 120, comma 1, lettera a)

Oggetto: **Relazione illustrativa**

Progettista: Geom. Alessandro Botta	Revisioni:		
Collaboratori: Geom. Davide Figoni	n.	Data	Oggetto
	0	21/11/2025	Emissione
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Felice Rocca			Numero elaborato:  <b>1</b>
File:			

## Sommario

<b>1</b>	<b>Premesse</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Variazioni rispetto all'appalto aggiudicato</b> .....	<b>2</b>

### **1 Premesse**

Considerato che ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante o l'ente concedente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria può omettere il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Ricordato che il Servizio Manutenzione ha predisposto il progetto esecutivo denominato "Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025" a firma del Geom. Alessandro Botta conservato agli atti del settore, conservato agli atti del settore e registrato al protocollo dell'Ente al n° 16326 del 06/08/2025.

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo "Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025" con D.G.C n° 92 del 12/08/2025.

A seguito dell'esperimento di procedura di scelta del contraente, è stato individuato quale affidatario l'operatore economico SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORIELLI, Via Carpenaro 15A MIOGLIA (SV) - C.F./P.IVA 01174200095, con un ribasso del 21,00% sull'importo a base di appalto.

L'aggiudicazione definitiva all'operatore economico individuato è stata disposta con determinazione n° 509 del 05/09/2025 RG n° 1808.

Il disciplinare di gara prevede all'articolo 1.4.13 la seguente clausola: "L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dell'appalto, secondo quanto previsto dal Codice, articolo 120, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale. In particolare il contratto potrà essere modificato in diminuzione senza limiti di valore monetario nel rispetto di quanto previsto dal Codice, articolo 120, comma 1, lettera a). L'amministrazione si riserva inoltre di far eseguire maggiori interventi fino alla concorrenza dell'intero importo a base di gara, estendendo anche ai lavori aggiuntivi il medesimo ribasso offerto in sede di gara.".

Le planimetrie di progetto individuavano alcune aree in cui effettuare eventuali maggiori interventi. Si è inoltre valutato opportuno pulire alcuni compluvi ed attraversamenti non censiti nel reticolo idrografico, che costituiscono note criticità in caso di pioggia.

### **2 Variazioni rispetto all'appalto aggiudicato**

Il presente progetto di modifica del contratto prevede di realizzare gli interventi già individuati come possibili in fase progettuale.

Inoltre durante i lavori sono emerse criticità:

- presenza di una fitta boscaglia lungo aree comunali che limitano la normale manutenzione delle raccolte d'acqua meteorica o che intralciano il normale deflusso di compluvi e scarichi non inseriti nel reticolo idrografico regionale;
- necessità di maggiori interventi di falciamento e decespugliamento sulle scarpate a monte dei rii per il contenimento degli arbusti e delle erbe infestanti che impediscono l'accesso e la manutenzione ai rii stessi oltre a creare un notevole accumulo di materiale che può portare all'intasamento degli alvei;
- necessità di falciamento di aree comunali per la regolare gestione delle canalizzazioni di raccolta ed allontanamento delle acque piovane.





**COMUNE DI VADO LIGURE**

**Provincia di Savona**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI  
TECNOLOGICI**

**Lavori di manutenzione ordinaria annuale di  
torrenti e rii sul territorio comunale.  
Anno 2025.**


**Modifica del contratto**

(D.Lgs. 36/2023, articolo 120, comma 1, lettera a)


Oggetto: **PLANIMETRIE SU BASE CTR**

Progettista: Geom. Alessandro Botta	Revisioni:		
Collaboratori: Geom. Davide Figoni	n.	Data	Oggetto
	0	21/11/2025	Emissione
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Felice Rocca	Scala:		Numero elaborato:
	1:2000		2
File:			


Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale.  
Anno 2025 - PLANIMETRIE SU BASE CTR.



**Interventi a progetto inclusi i maggiori lavori**

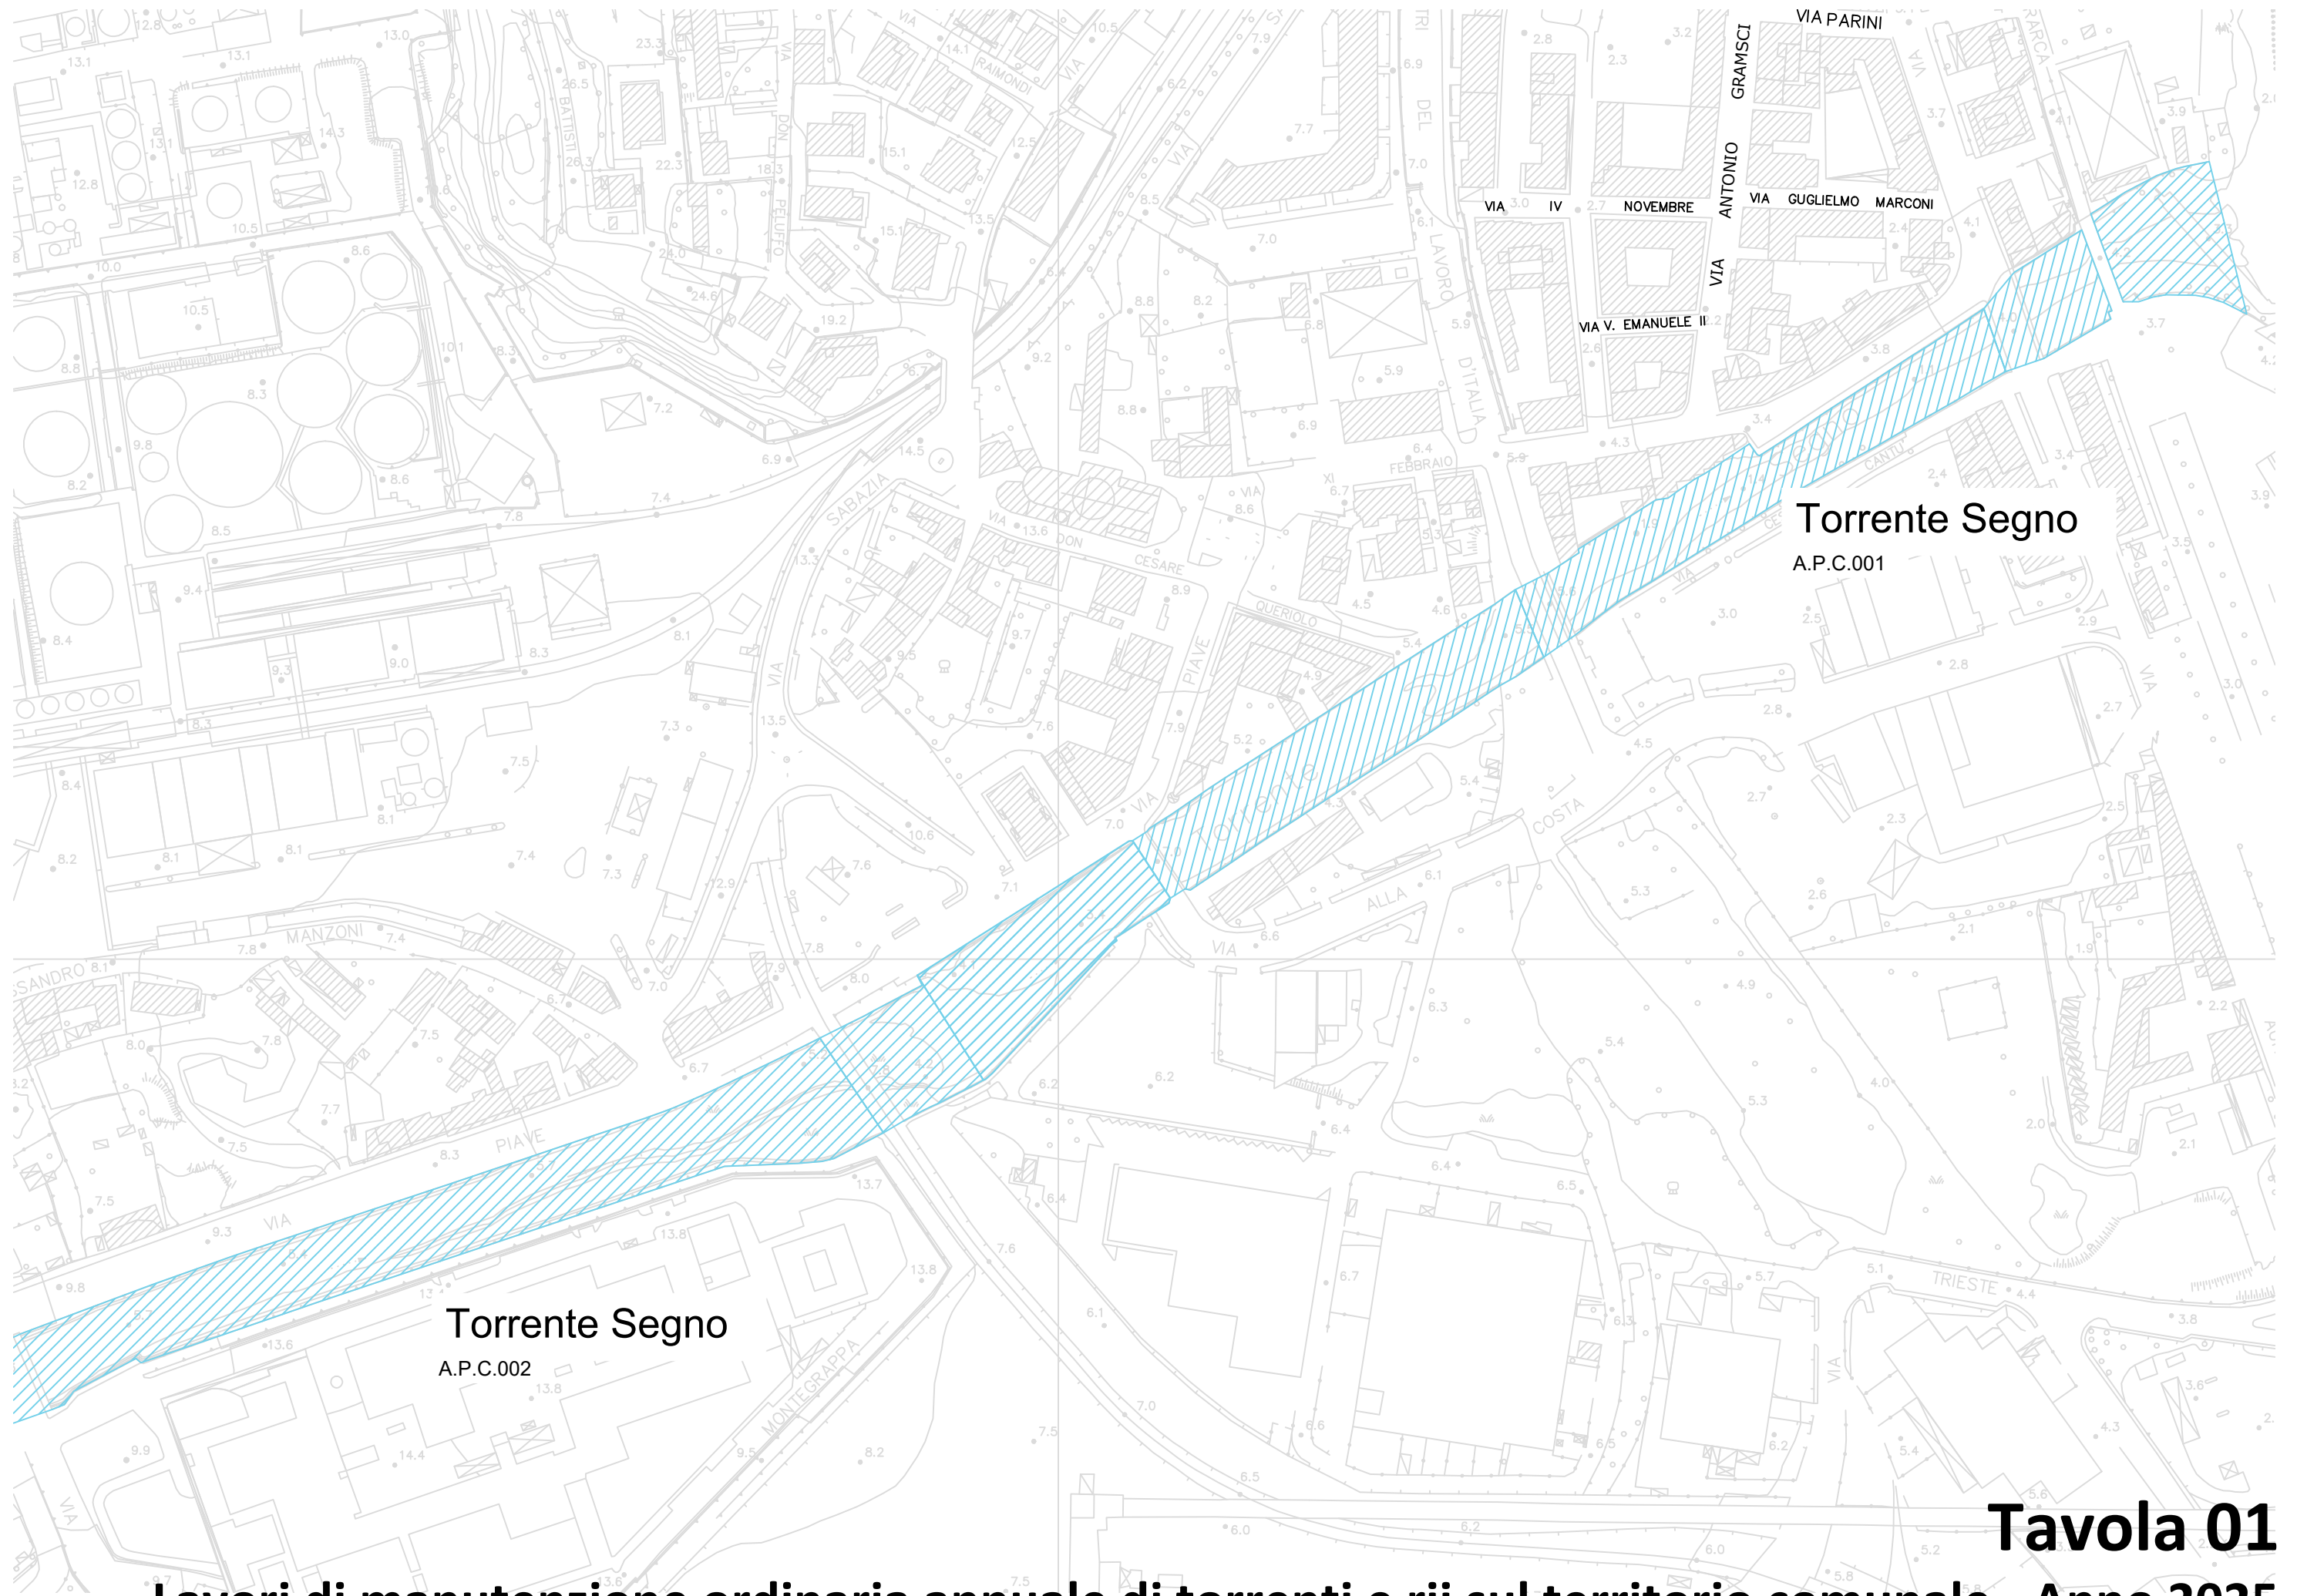



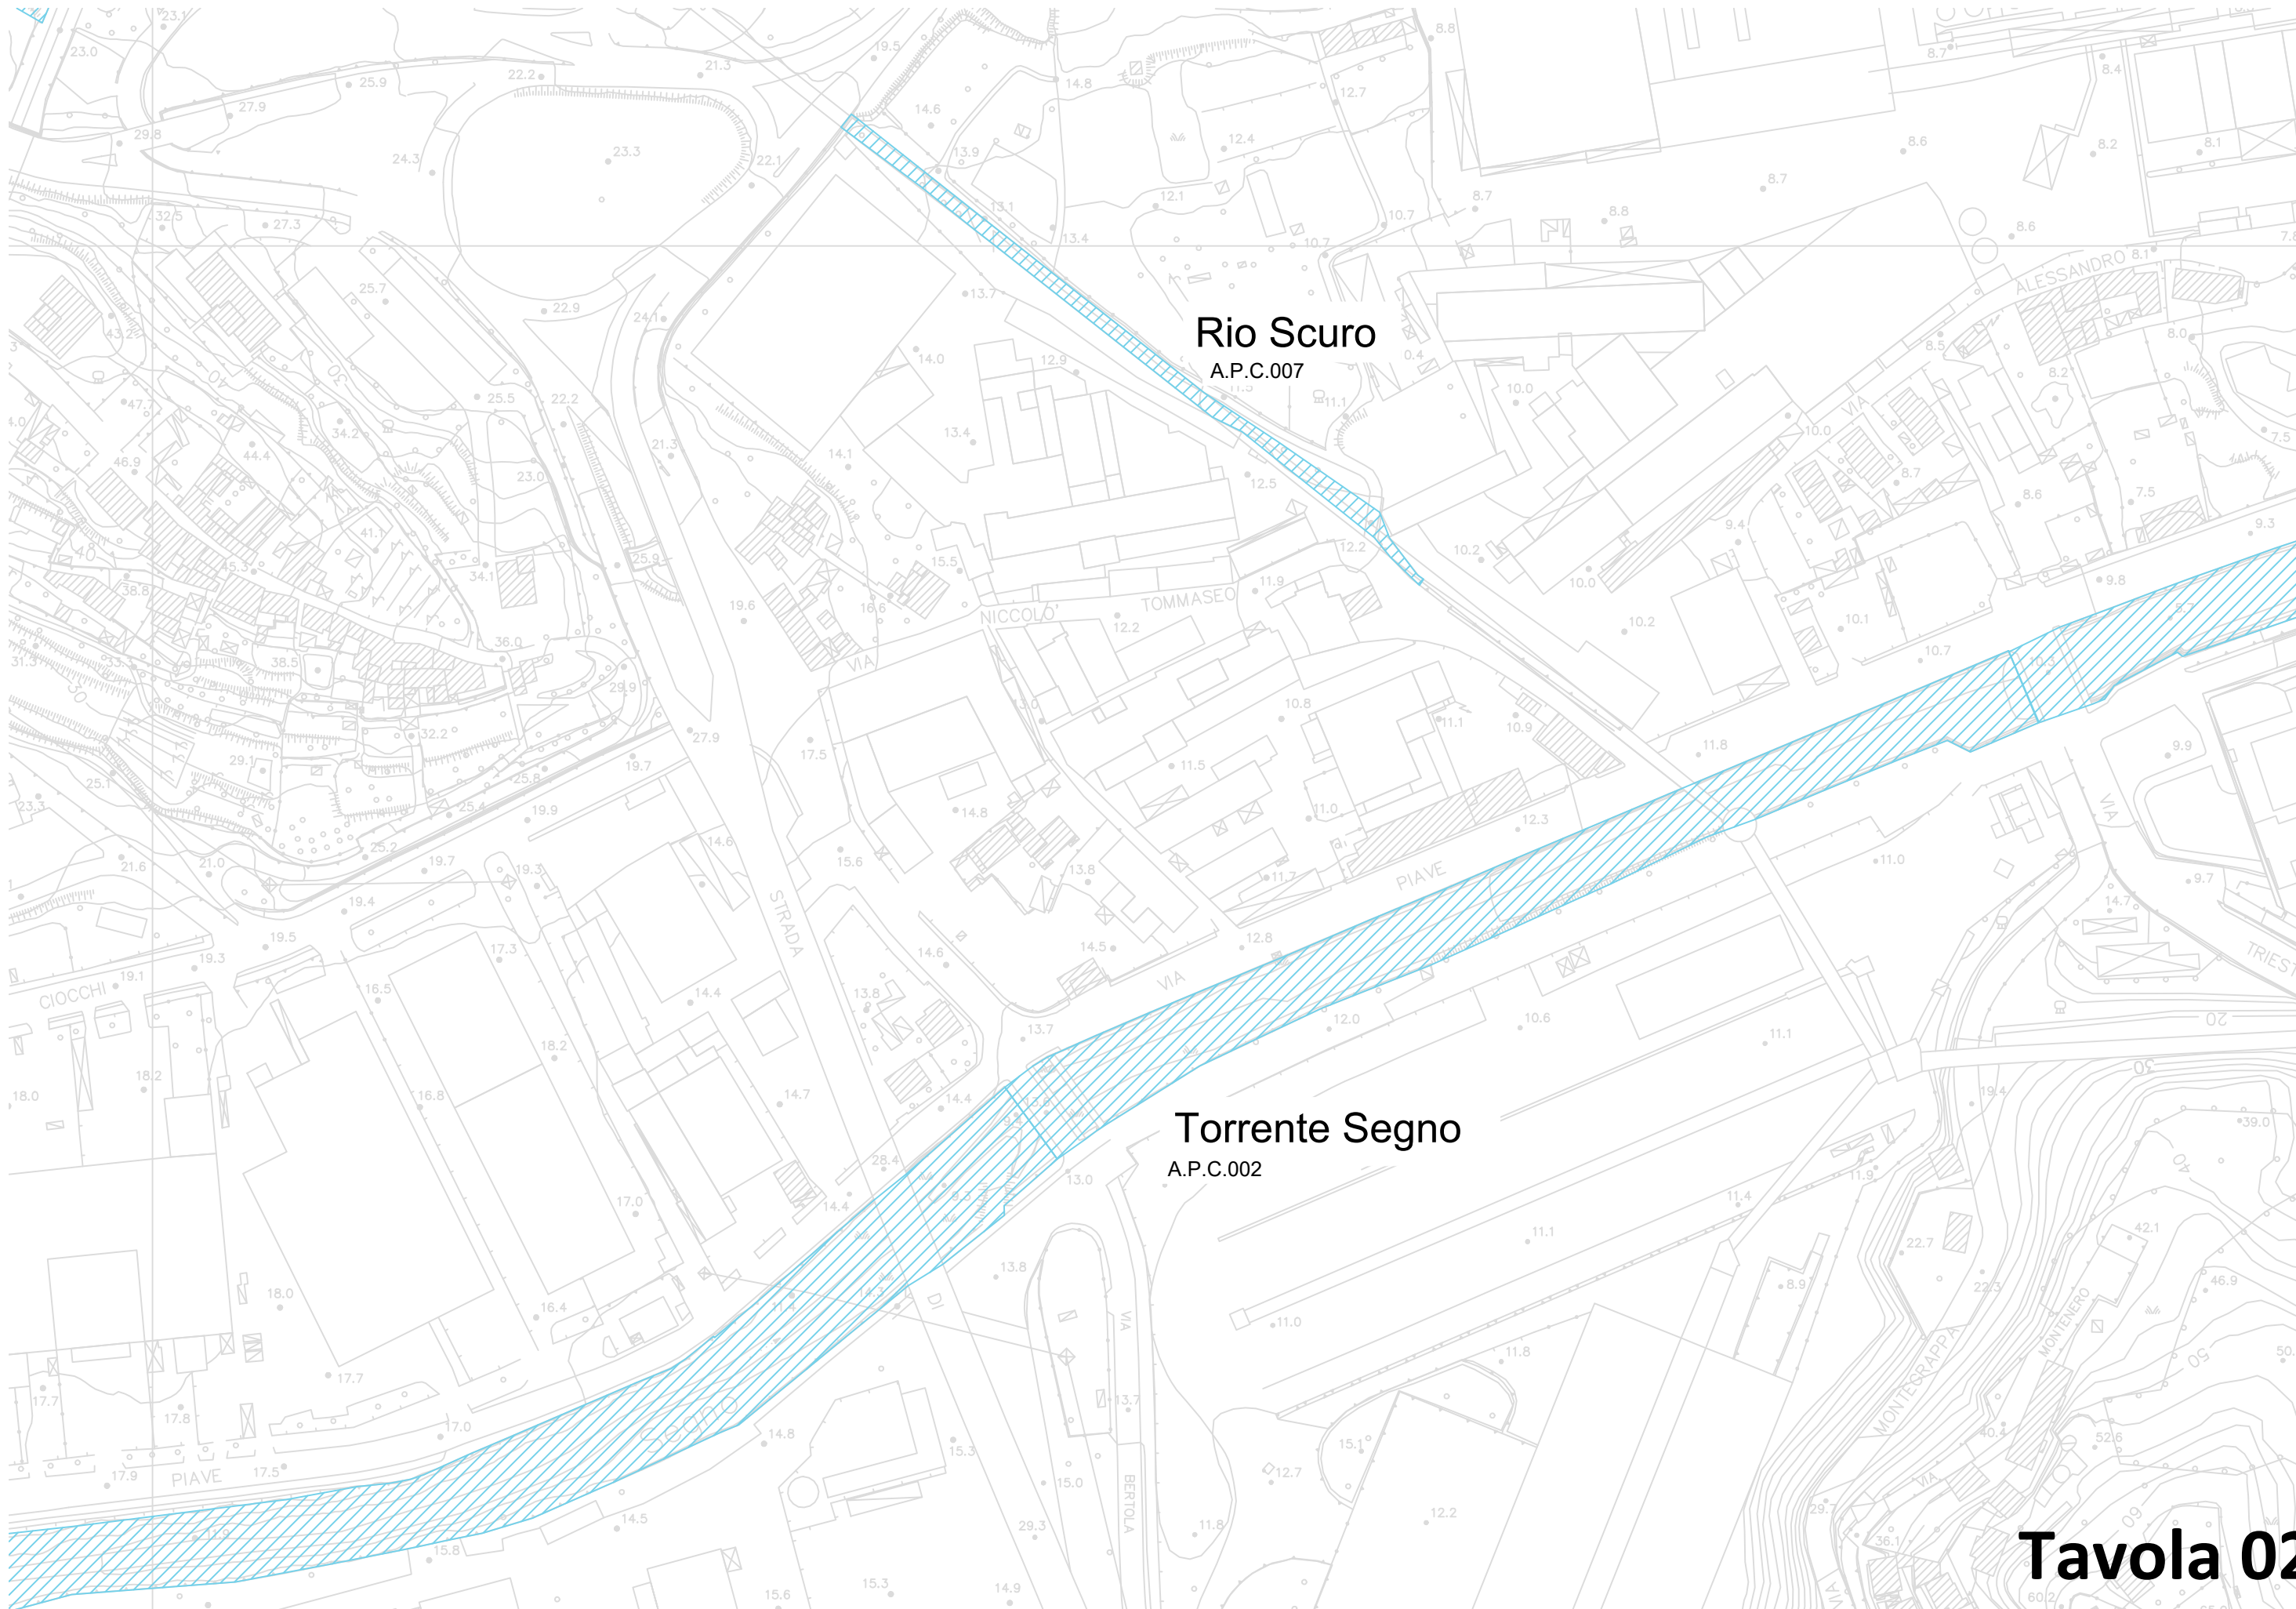

Rio Scuro  
A.P.C.007

Torrente Segno  
A.P.C.002



**Rio della Valle**  
A.P.C.011

**Rio Ballaina**  
A.P.C.010

**Rio Termini**  
A.P.C.008


**Torrente Segno**  
A.P.C.002

**Rio Terrusso**  
A.P.C.009

**Tavola 03**


**Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025**



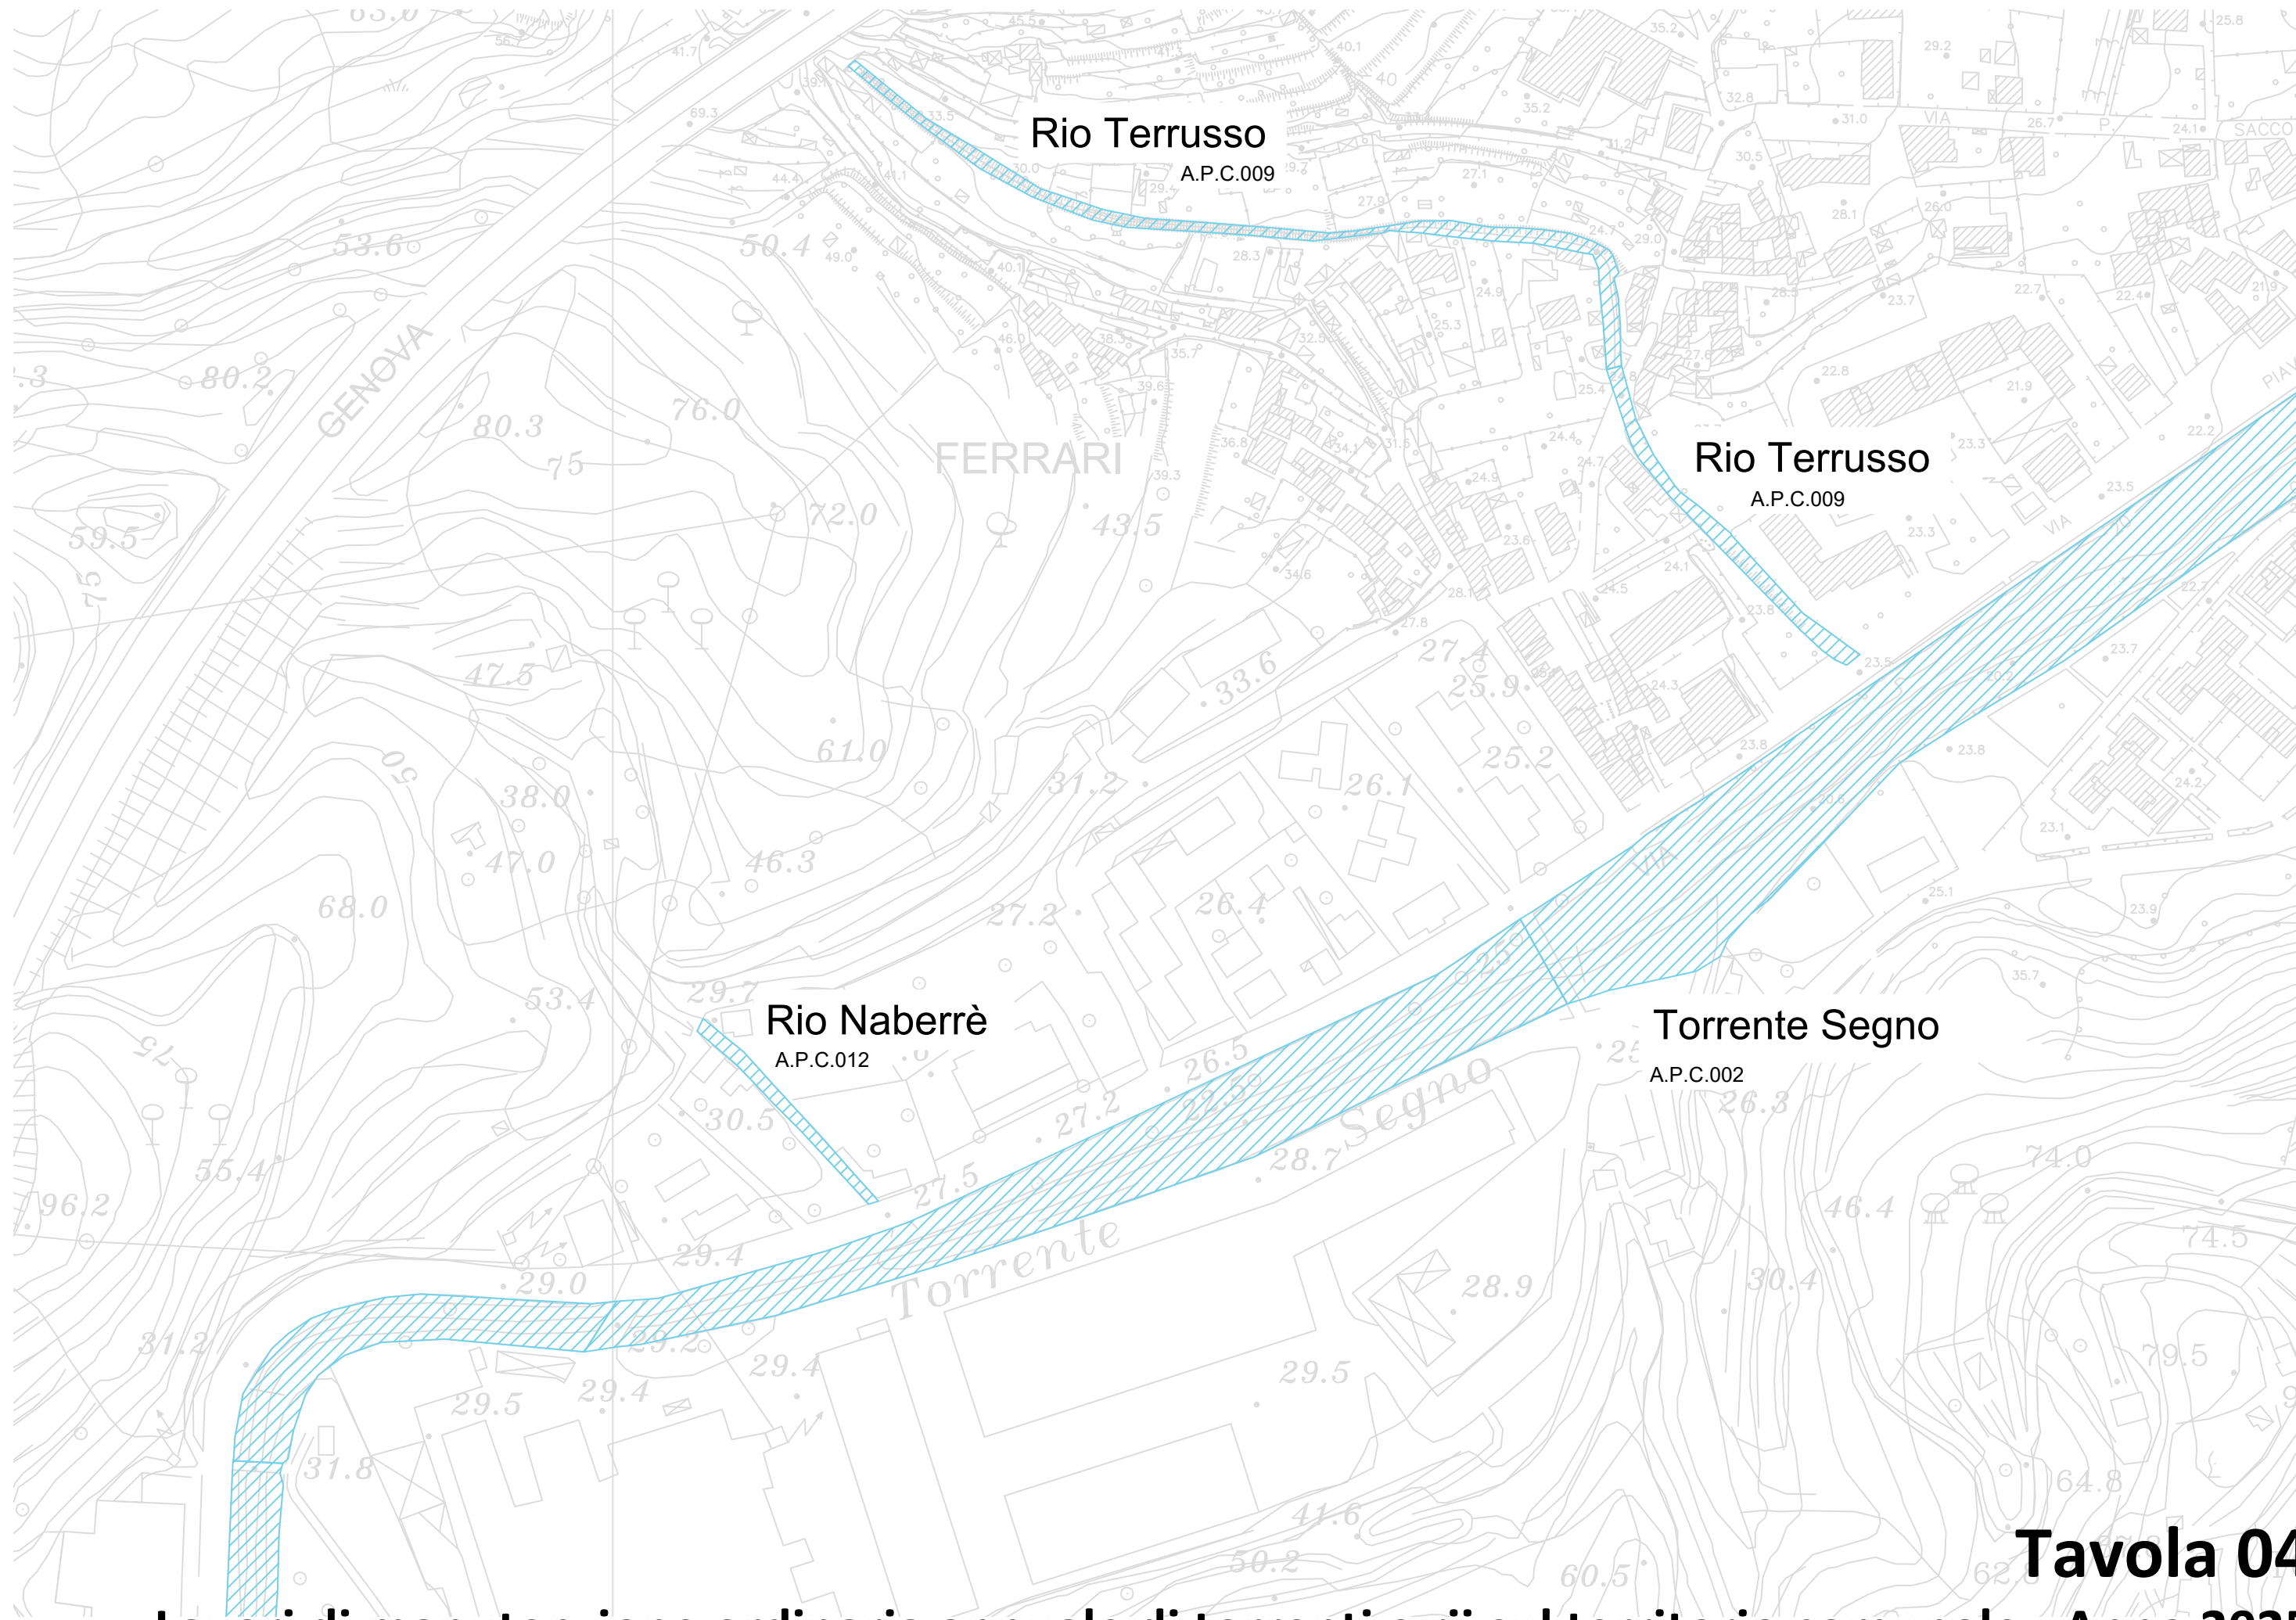

**Tavola 04**  
**Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025**



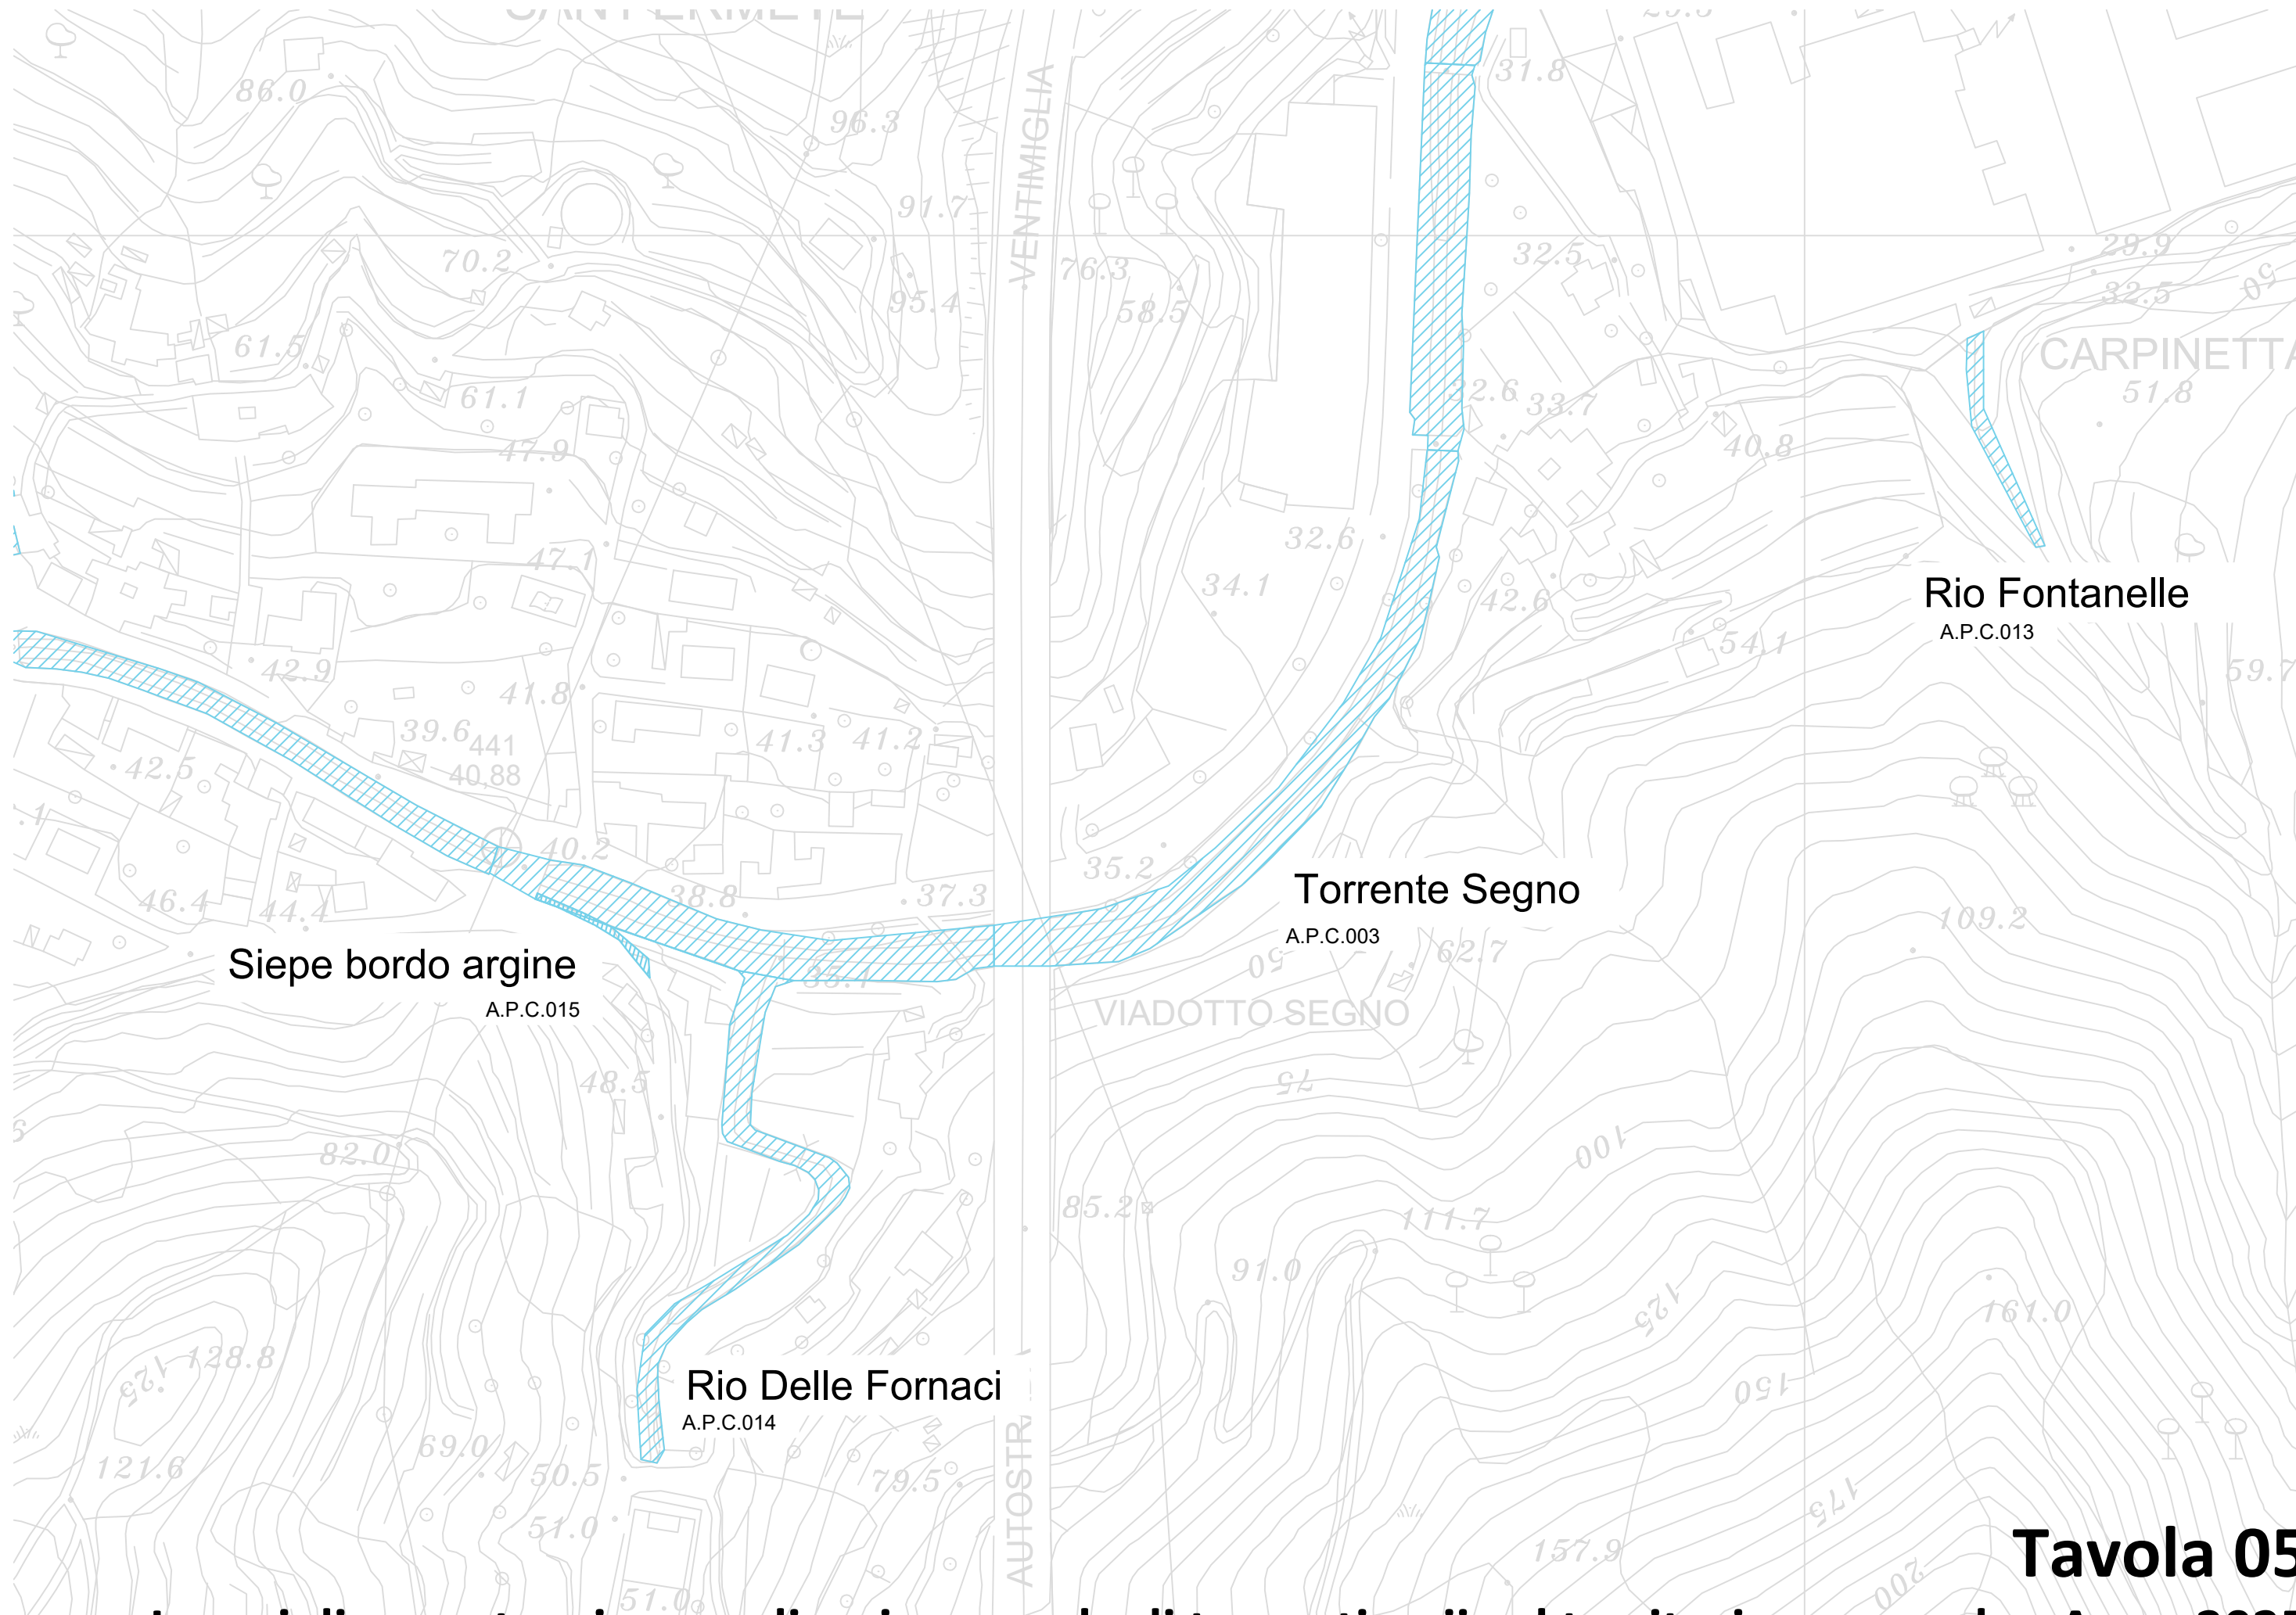

**Tavola 05**  
**Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025**








**Tavola 07**  
**Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025**









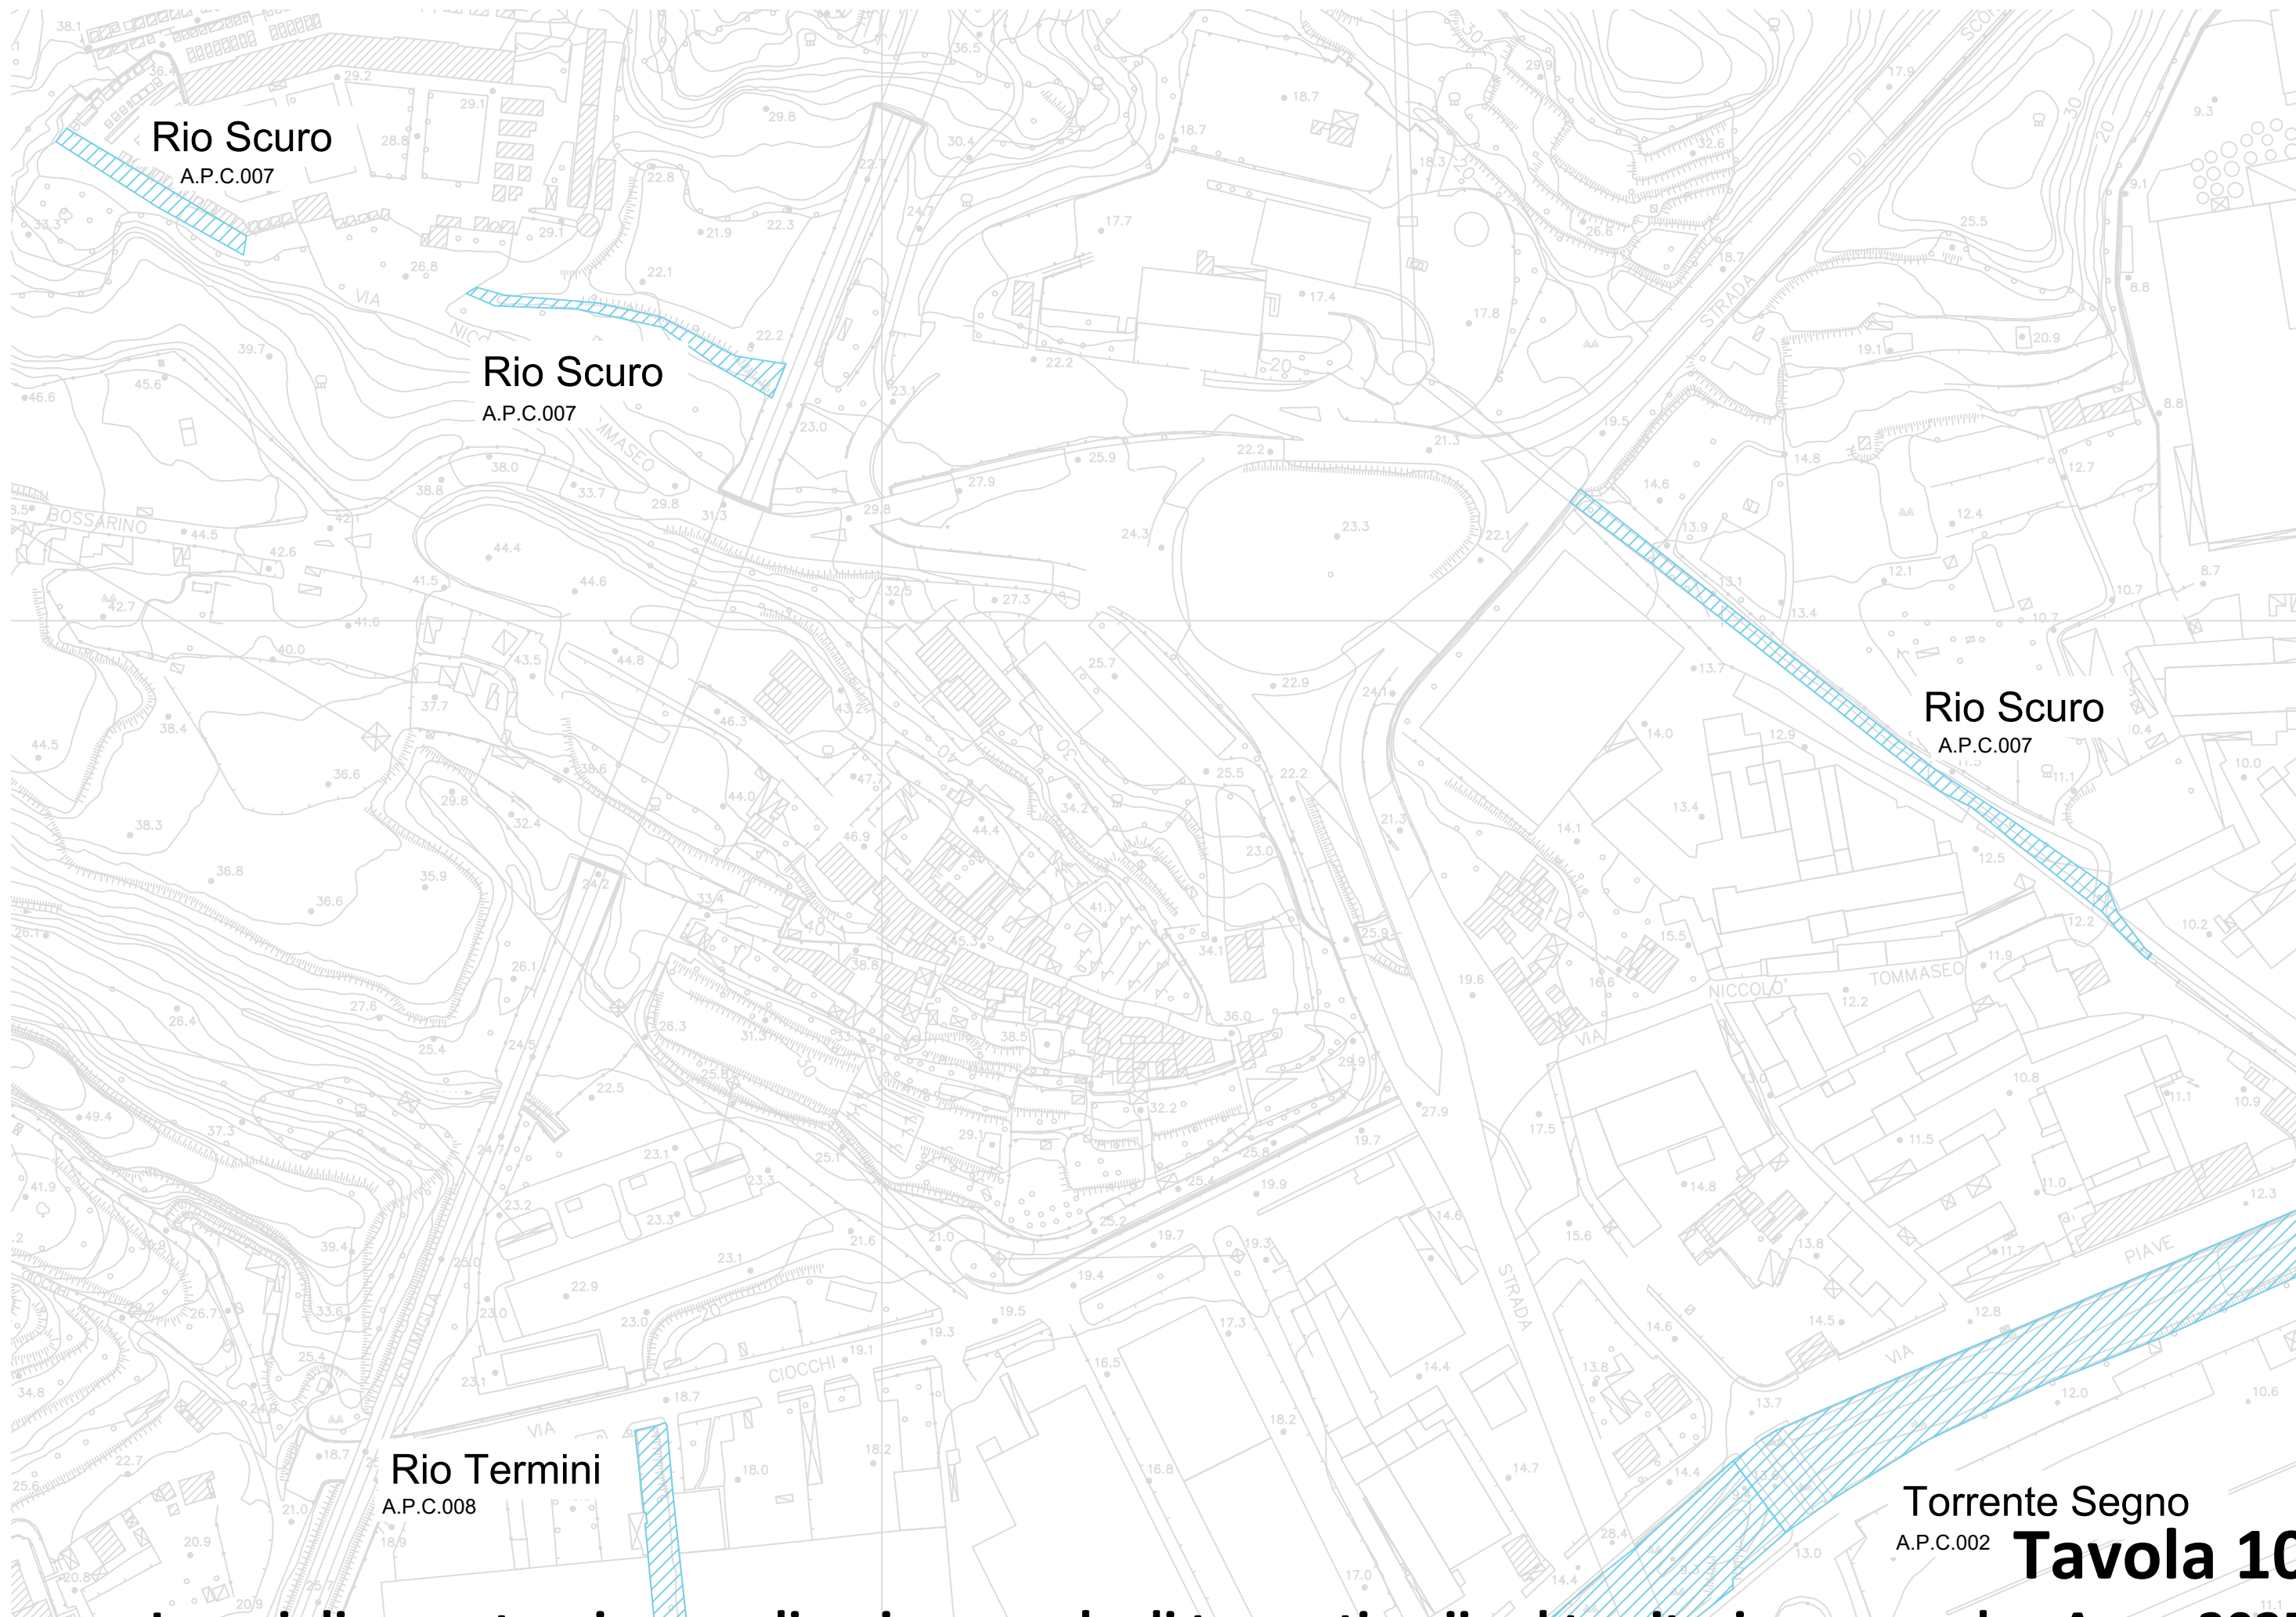


Torrente Segno  
A.P.C.002

# Tavola 10

## Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025



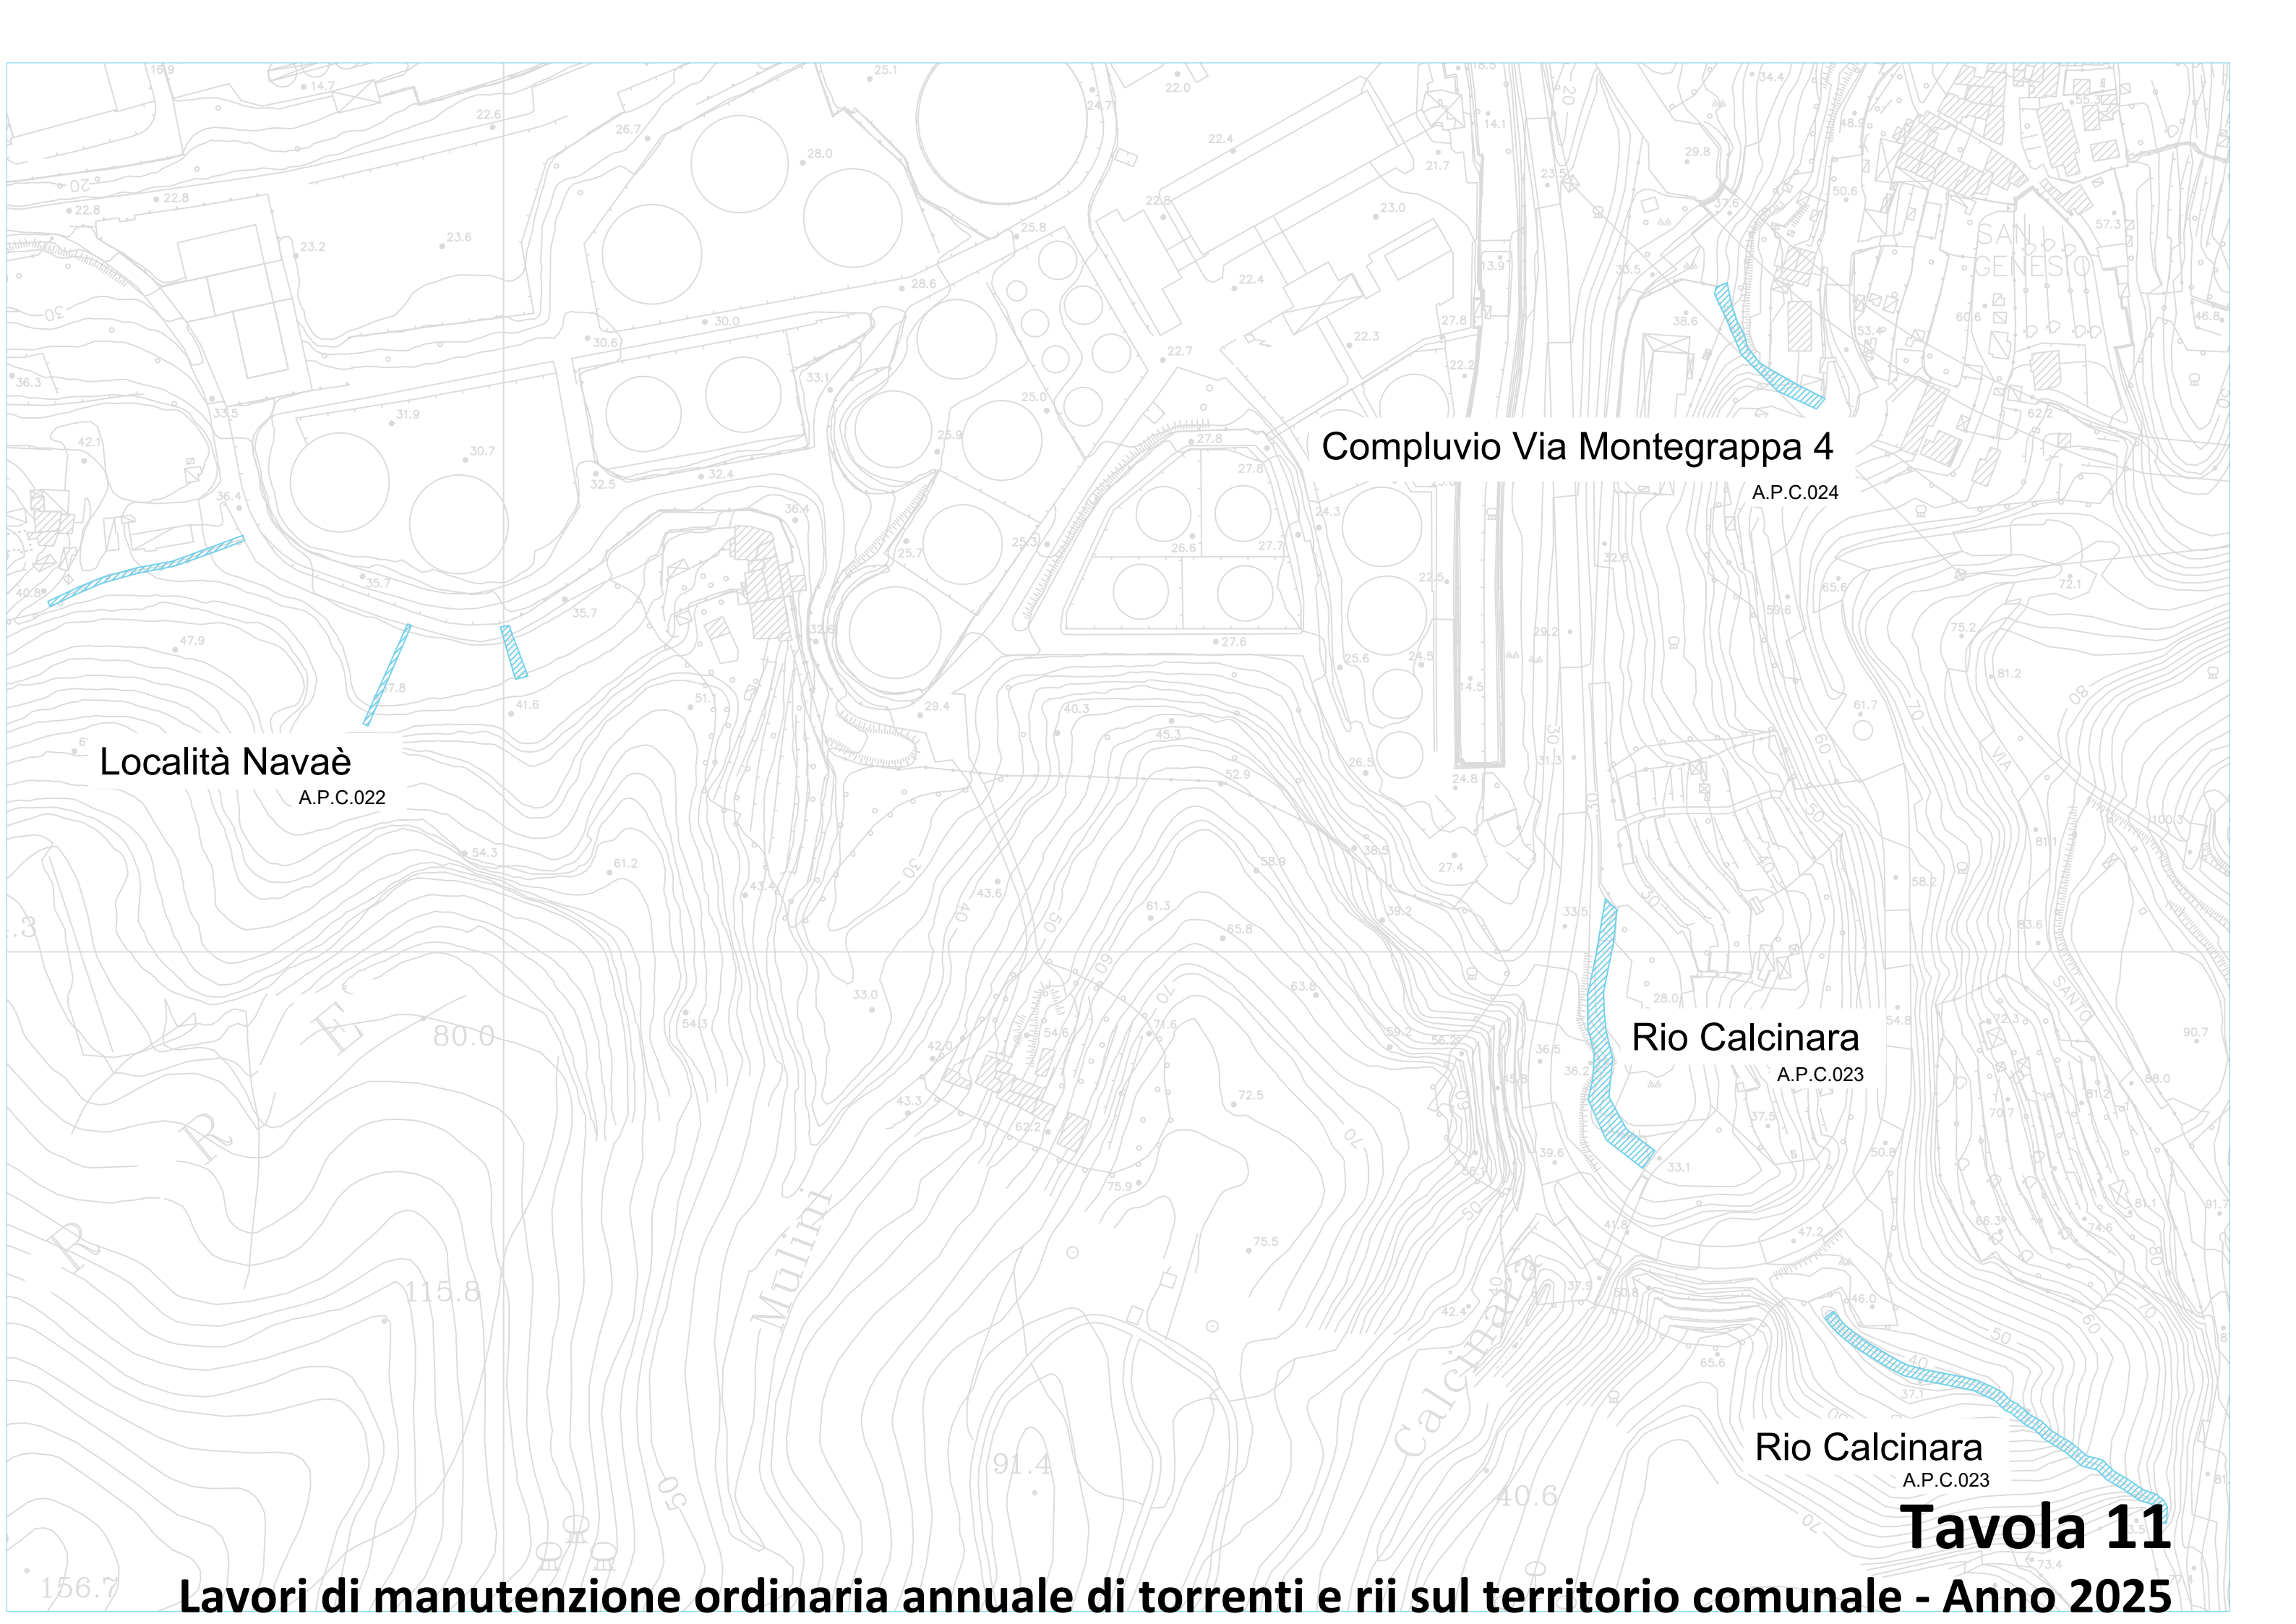

Località Navaè  
A.P.C.022

Compluvio Via Montegrappa 4  
A.P.C.024

Rio Calcinara  
A.P.C.023


Rio Calcinara  
A.P.C.023

Tavola 11

Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025






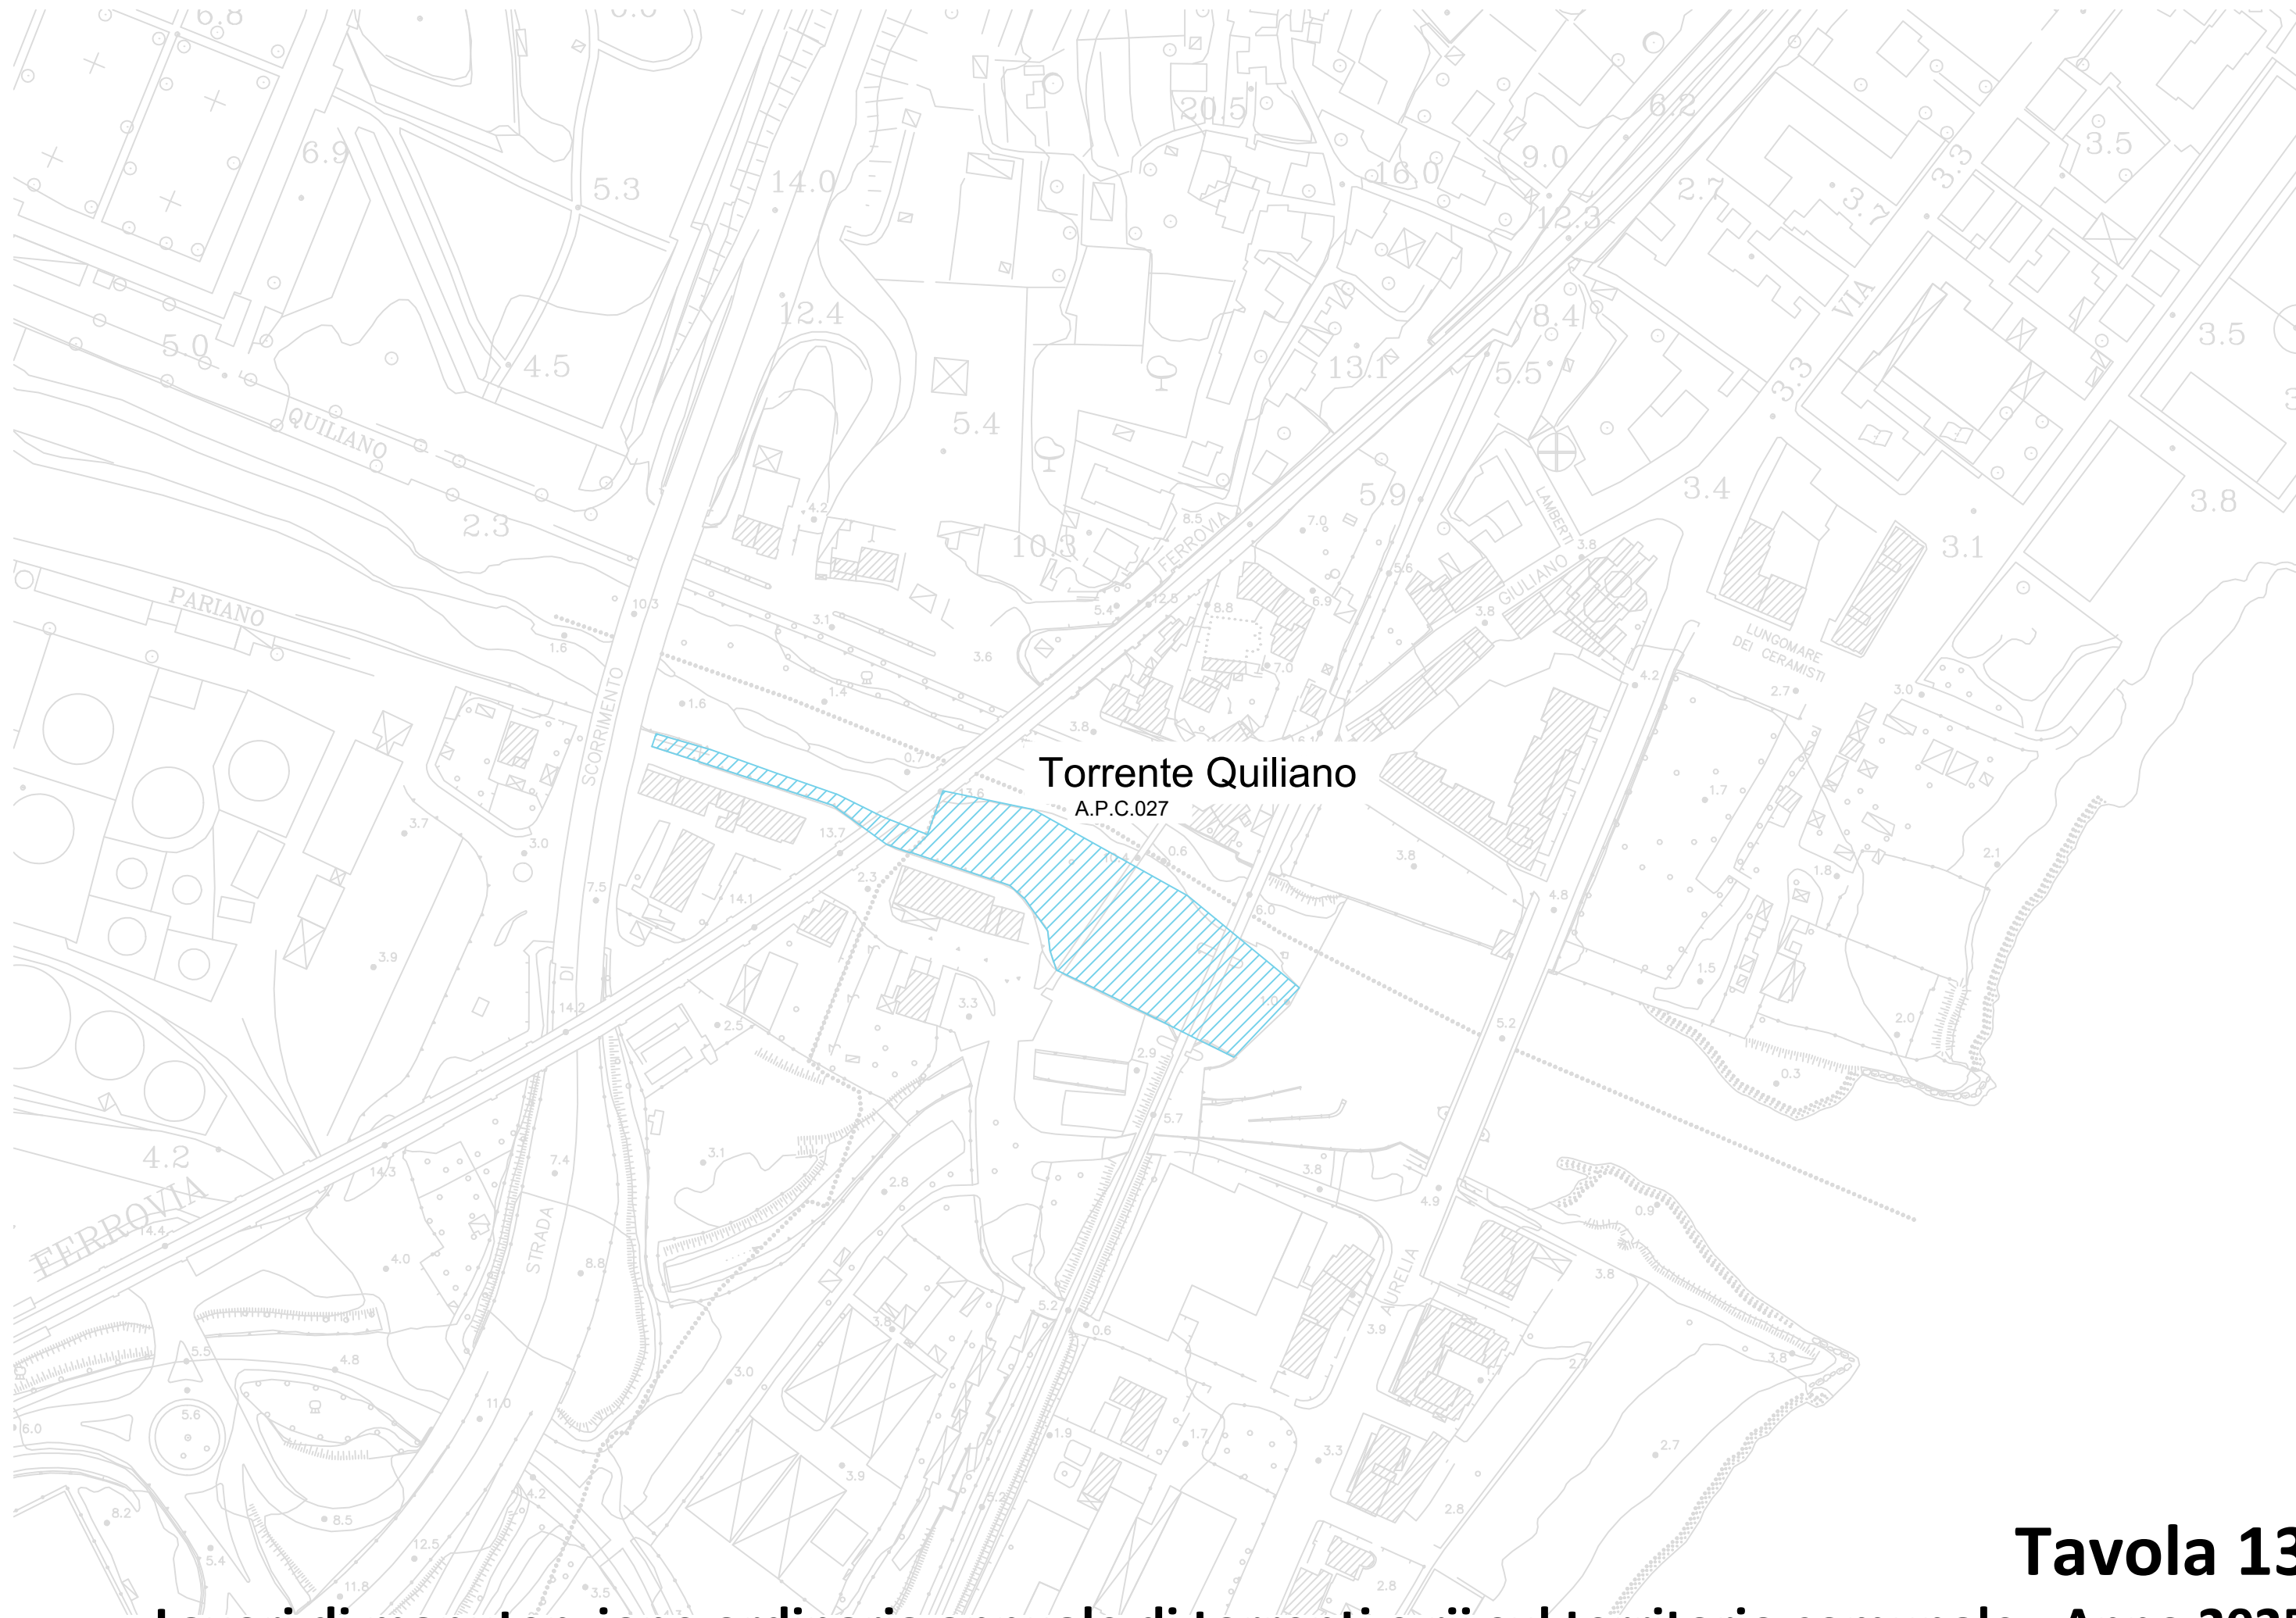


# Tavola 13

Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025



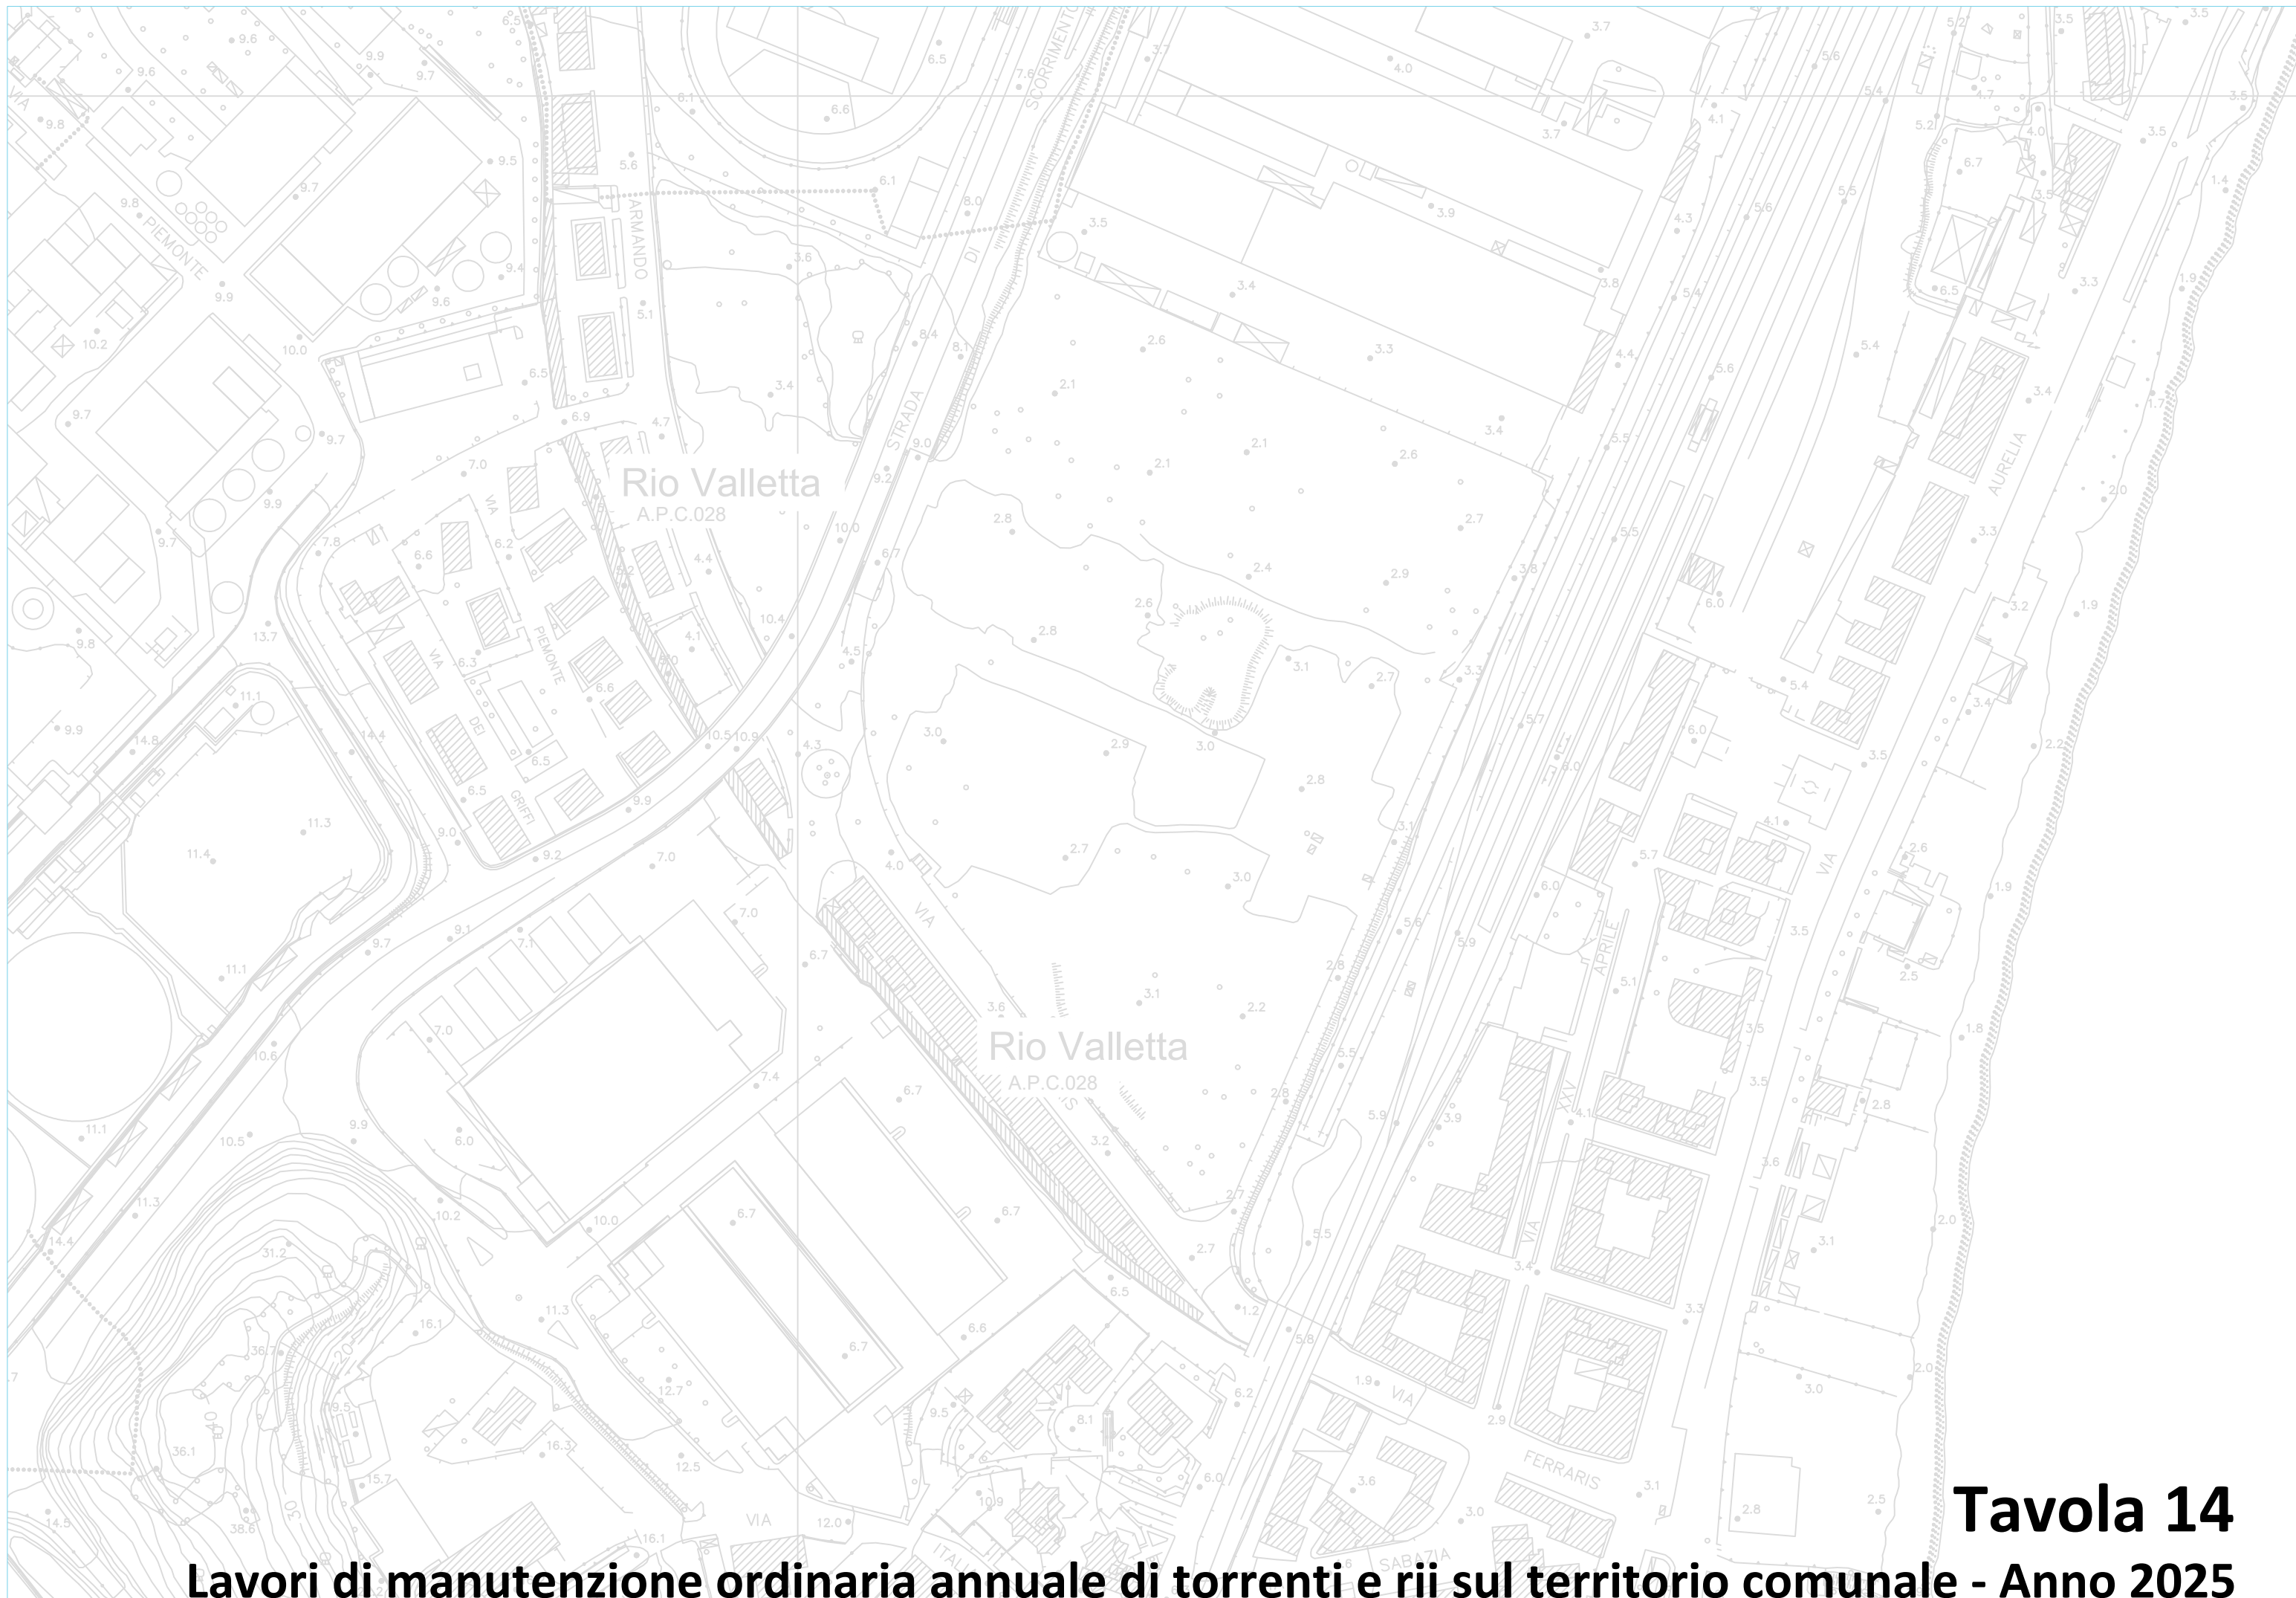




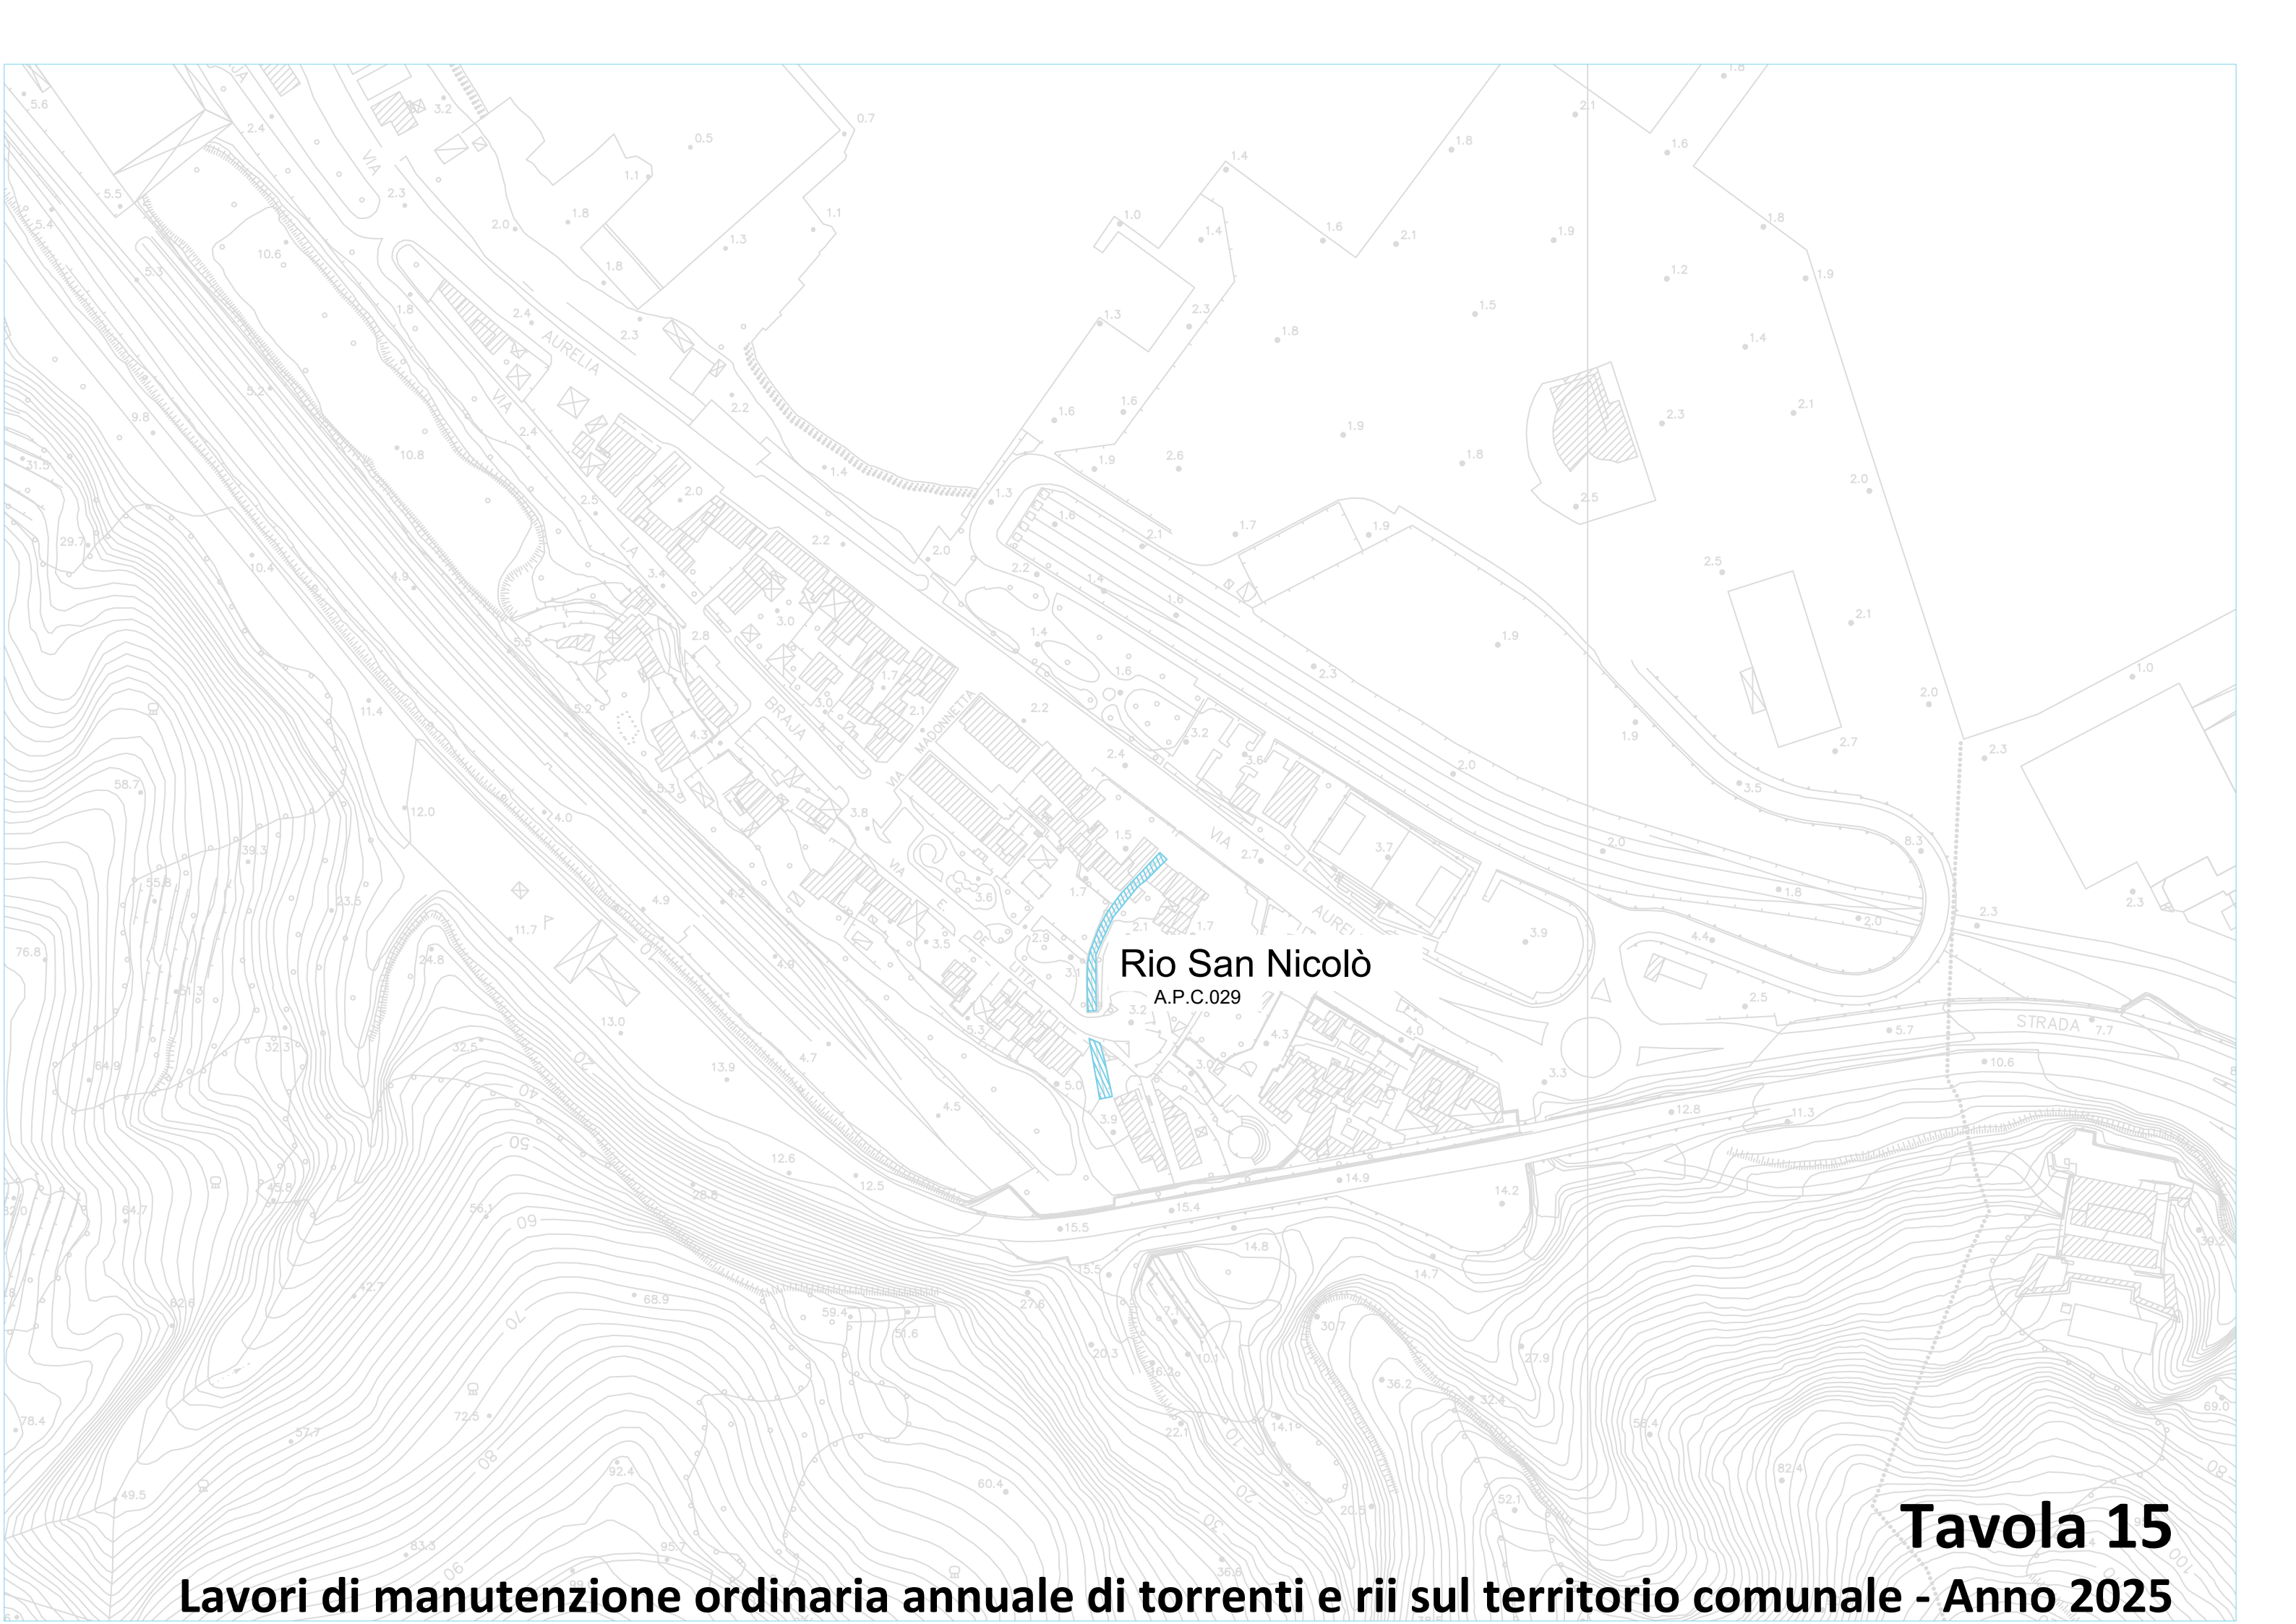

Rio San Nicolò  
A.P.C.029

**Tavola 15**  
**Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025**



**Comune di Vado Ligure**  
**Provincia di Savona**

pag. 1

# **ELENCO PREZZI**

## **Lavori a Corpo e a Misura**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025.  
Modifica del contratto  
(D.Lgs. 36/2023, articolo 120, comma 1, lettera a)

**COMMITTENTE:** Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Vado Ligure, 21/11/2025

**IL TECNICO**  
Geom. Alessandro Botta


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b><u>VOCIA MISURA</u></b>		
Nr. 1 75.A10.A20. 020	Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (zero/853)</b>	m²	0,853
Nr. 2 75.A10.A40. 020	Sfalcio di erbe eseguito con mezzo meccanico, misurato sulla superficie effettiva di sfalcio eseguito, per erbe non falciate da due o piu' anni <b>euro (zero/743)</b>	m²	0,743
Nr. 3 A.P.001	TAGLIO SELETTIVO di alberature di diametro, misurato a 1.00 m dal colletto, compreso tra 8.01 cm e 50 cm, in ambito fluviale, con sponde di qualsiasi acclività, compreso abbattimento di piante arboree morte, sradicate e/o pericolanti e/o a rischio di caduta, ubicate nell'alveo attivo e sulle sponde, nonché di tronchi d'albero abbattuti e/o caduti in alveo e delle relative ramaglie. Intervento comprensivo di ogni onere e attrezzatura, incluso l'amminutamento in pezzatura di lunghezza inferiore a 1-1,50 m e il relativo accatastamento, eseguito esclusivamente a mano e/o con l'ausilio di verricelli portatili, al di fuori dell'alveo interessato dal regime di massima piena, nel rispetto delle norme di polizia forestale vigenti. Il materiale depezzato dovrà essere sistemato in piccole cataste nei terreni ripari in modo da non costituire intralcio al regolare deflusso e da formare nuovo micro habitat e relative reti alimentari. Escluso l'onere della rimozione delle ceppaie. Compresa la raccolta e la rimozione dei materiali assimilabili a R.S.U. attraverso il servizio di N.U. comunale, mentre per altri eventuali tipologie di rifiuti presenti in alveo dovrà essere data informativa al comune interessato. Per esemplari individuati dalla D.L. <b>euro (quarantasette/40)</b>	cadauno	47,400
Nr. 4 A.P.C.001	Torrente Segno - tratto compreso tra la foce e Via alla Costa - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (quattromilacinquecentotré/00)</b>	a corpo	4'503,000
Nr. 5 A.P.C.002	Torrente Segno - tratto compreso tra Via alla Costa e Chiesa della Valle - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (ventiduemilasettecentocinquantadue/00)</b>	a corpo	22'752,000
Nr. 6 A.P.C.003	Torrente Segno - tratto compreso tra Chiesa della Valle e Ponte S. Ermete (Via Pertinace) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (ottomilaquattrocentocinquantaquattro/00)</b>	a corpo	8'453,000
Nr. 7 A.P.C.004	Torrente Segno - tratto compreso tra Ponte S. Ermete (Via Pertinace) e ponte verso zona 167 - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (cinquemilanovecentoventicinque/00)</b>	a corpo	5'925,000
Nr. 8 A.P.C.005	Torrente Segno - tratto compreso tra ponte verso zona 167 e Ponte dell'Isola - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (diecimilacentododici/00)</b>	a corpo	10'112,000
Nr. 9 A.P.C.006	Torrente Segno - tratto a monte di Ponte dell'Isola (Via Vezzi) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (tremilatrecentodiciotto/00)</b>	a corpo	3'318,000
Nr. 10 A.P.C.007	Rio Scuro - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (duemilatrecentosettanta/00)</b>	a corpo	2'370,000
Nr. 11 A.P.C.008	Rio Termini - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (millesettecentotrentaotto/00)</b>	a corpo	1'738,000
Nr. 12 A.P.C.009	Rio Terrusso - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (milleseicentocinquantanove/00)</b>	a corpo	1'659,000
Nr. 13 A.P.C.010	Rio Ballaina - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (trecentosedici/00)</b>	a corpo	316,000
Nr. 14	Rio Della Valle -		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A.P.C.011	Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (millecentosei/00)</b>	a corpo	1'106,000
Nr. 15 A.P.C.012	Rio Naberrè - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (quattrocentosettantaquattro/00)</b>	a corpo	474,000
Nr. 16 A.P.C.013	Rio Fontanelle - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (trecentonovantacinque/00)</b>	a corpo	395,000
Nr. 17 A.P.C.014	Rio Fornace (Rio delle fornaci) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (millecinquecentoottanta/00)</b>	a corpo	1'580,000
Nr. 18 A.P.C.015	Siepe Bordo Argine T. Segno Loc. Sant'Ermite - Riprofilatura di contenimento di una siepe sita sull'argine del T. Segno in Loc. San'Ermite a margine di Via Lazio, sia lato torrente sia lato strada, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura. <b>euro (centocinquantaotto/00)</b>	a corpo	158,000
Nr. 19 A.P.C.016	Rio delle Giue - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (duemilasettecentosessantacinque/00)</b>	a corpo	2'765,000
Nr. 20 A.P.C.017	Rio Rivassa - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (trecentonovantacinque/00)</b>	a corpo	395,000
Nr. 21 A.P.C.018	Rio Barrè - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (trecentosedici/00)</b>	a corpo	316,000
Nr. 22 A.P.C.019	Rio Ca Lotta - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (duemiladuecentododici/00)</b>	a corpo	2'212,000
Nr. 23 A.P.C.020	Compluvio Via N. Bixio (Loc. Segno) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (settantanove/00)</b>	a corpo	79,000
Nr. 24 A.P.C.021	Compluvio Via B. Peluffò (Loc. Segno) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (trecentonovantacinque/00)</b>	a corpo	395,000
Nr. 25 A.P.C.022	Rio località Navarrè (Via Nà Torre) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (trecentonovantacinque/00)</b>	a corpo	395,000
Nr. 26 A.P.C.023	Rio Calcinara - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (milleottocentodiciassette/00)</b>	a corpo	1'817,000
Nr. 27 A.P.C.024	Compluvio Via Montegrappa 4 (Loc. San Genesio) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (trecentosedici/00)</b>	a corpo	316,000
Nr. 28 A.P.C.025	Rio Canaa (Via Contrada) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² <b>euro (cinquecentocinquantatre/00)</b>	a corpo	553,000









## Comune di Vado Ligure Provincia di Savona

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025.  
Modifica del contratto  
(D.Lgs. 36/2023, articolo 120, comma 1, lettera a)

**COMMITTENTE:** Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Vado Ligure, 21/11/2025

**IL TECNICO**  
Geom. Alessandro Botta

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 A.P.C.001	Torrente Segno - tratto compreso tra la foce e Via alla Costa - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'503,000	4'503,00
2 A.P.C.002	Torrente Segno - tratto compreso tra Via alla Costa e Chiesa della Valle - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	22'752,000	22'752,00
3 A.P.C.003	Torrente Segno - tratto compreso tra Chiesa della Valle e Ponte S. Ermete (Via Pertinace) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'453,000	8'453,00
4 A.P.C.004	Torrente Segno - tratto compreso tra Ponte S. Ermete (Via Pertinace) e ponte verso zona 167 - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianos ... , ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'925,000	5'925,00
5 A.P.C.005	Torrente Segno - tratto compreso tra ponte verso zona 167 e Ponte dell'Isola - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'112,000	10'112,00
6 A.P.C.006	Torrente Segno - tratto a monte di Ponte dell'Isola (Via Vezzi) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'318,000	3'318,00
7 A.P.C.007	Rio Scuro - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							55'063,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'063,00
8 A.P.C.008	vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	2'370,000	2'370,00
						1,00		
9 A.P.C.009	Rio Termini - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	1'738,000	1'738,00
						1,00		
10 A.P.C.010	Rio Terrusso - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	1'659,000	1'659,00
						1,00		
11 A.P.C.011	Rio Ballaina - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	316,000	316,00
						1,00		
12 A.P.C.012	Rio Della Valle - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	1'106,000	1'106,00
						1,00		
13 A.P.C.013	Rio Naberrè - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	474,000	474,00
						1,00		
14 A.P.C.014	Rio Fontanelle - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	395,000	395,00
						1,00		
	A R I P O R T A R E							63'121,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63'121,00
15 A.P.C.015	vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'580,000	1'580,00
16 A.P.C.016	Siepe Bordo Argine T. Segno Loc. Sant'Ermite - Riprofilatura di contenimento di una siepe sita sull'argine del T. Segno in Loc. San'Ermite a margine di Via Lazio, sia lato torrent ... eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura.				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	158,000	158,00
17 A.P.C.017	Rio delle Giue - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'765,000	2'765,00
18 A.P.C.018	Rio Rivassa - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	395,000	395,00
19 A.P.C.019	Rio Barrè - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	316,000	316,00
20 A.P.C.020	Rio Ca Lotta - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'212,000	2'212,00
21 A.P.C.021	Compluvio Via N. Bixio (Loc. Segno) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	79,000	79,00
	A R I P O R T A R E							70'626,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'626,00
22 A.P.C.022	vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	395,000	395,00
						1,00		
23 A.P.C.023	Rio località Navarrè (Via Nà Torre) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	395,000	395,00
						1,00		
24 A.P.C.024	Rio Calcinara - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	1'817,000	1'817,00
						1,00		
25 A.P.C.025	Compluvio Via Montegrappa 4 (Loc. San Genesio) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	316,000	316,00
						1,00		
26 A.P.C.027	Rio Canaa (Via Contrada) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	553,000	553,00
						1,00		
27 A.P.C.029	Torrente Quiliano - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	2'133,000	2'133,00
						1,00		
28 75.A10.A20. 020	Rio San Nicolò (Loc. Porto Vado) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  SOMMANO a corpo				1,000	1,00	237,000	237,00
						1,00		
	A R I P O R T A R E							76'472,00









**Comune di Vado Ligure**  
Provincia di Savona

pag. 1

## QUADRO COMPARATIVO

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025.  
Modifica del contratto  
(D.Lgs. 36/2023, articolo 120, comma 1, lettera a)

**COMMITTENTE:** Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Vado Ligure, 21/11/2025

**IL TECNICO**  
Geom. Alessandro Botta

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>									
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>									
1 75.A10.A20. 020	Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  Sommano m²	---	9'000,00	9'000,00	0,853	---	7'677,00	7'677,00		
2 75.A10.A40. 020	Sfalcio di erbe eseguito con mezzo meccanico, misurato sulla superficie effettiva di sfalcio eseguito, per erbe non falciate da due o piu' anni  Sommano m²	---	2'700,00	2'700,00	0,743	---	2'006,10	2'006,10		
3 A.P.001	TAGLIO SELETTIVO di alberature di diametro, misurato a 1.00 m dal colletto, compreso tra 8.01 cm e 50 cm, in ambito fluviale, con sponde di qualsiasi acclività, compreso abbattimen ... e di rifiuti presenti in alveo dovrà essere data informativa al comune interessato. Per esemplari individuati dalla D.L.  Sommano cadauno	---	50,00	50,00	47,400	---	2'370,00	2'370,00		
4 A.P.C.001	Torrente Segno - tratto compreso tra la foce e Via alla Costa - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  Sommano a corpo	1,00	1,00	---	4'503,000	4'503,00	4'503,00			
5 A.P.C.002	Torrente Segno - tratto compreso tra Via alla Costa e Chiesa della Valle - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  Sommano a corpo	1,00	1,00	---	22'752,000	22'752,00	22'752,00			
6 A.P.C.003	Torrente Segno - tratto compreso tra Chiesa della Valle e Ponte S. Ermete (Via Pertinace) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  Sommano a corpo	1,00	1,00	---	8'453,000	8'453,00	8'453,00			
7 A.P.C.004	Torrente Segno - tratto compreso tra Ponte S. Ermete (Via Pertinace) e ponte verso zona 167 - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianos ... , ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  Sommano a corpo	1,00	1,00	---	5'925,000	5'925,00	5'925,00			
8 A.P.C.005	Torrente Segno - tratto compreso tra ponte verso zona 167 e Ponte dell'Isola - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.),									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							12'053,10		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							12'053,10		
9 A.P.C.006	compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² Sommano a corpo	1,00	1,00	---	10'112,000	10'112,00	10'112,00			
10 A.P.C.007	Torrente Segno - tratto a monte di Ponte dell'Isola (Via Vezzi) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² Sommano a corpo	1,00	1,00	---	3'318,000	3'318,00	3'318,00			
11 A.P.C.008	Rio Scuro - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2'370,000	2'370,00	2'370,00			
12 A.P.C.009	Rio Termini - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'738,000	1'738,00	1'738,00			
13 A.P.C.010	Rio Terrusso - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'659,000	1'659,00	1'659,00			
14 A.P.C.011	Rio Ballaina - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² Sommano a corpo	1,00	1,00	---	316,000	316,00	316,00			
15 A.P.C.012	Rio Della Valle - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m² Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'106,000	1'106,00	1'106,00			
	Rio Naberrè - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²									
	A R I P O R T A R E							12'053,10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							12'053,10		
16 A.P.C.013	Rio Fontanelle - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²	1,00	1,00	---	474,000	474,00	474,00			
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	395,000	---	395,00	395,00		
17 A.P.C.014	Rio Fornace (Rio delle fornaci) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²	---	1,00	1,00	1'580,000	---	1'580,00	1'580,00		
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	158,000	---	158,00	158,00		
18 A.P.C.015	Siepe Bordo Argine T. Segno Loc. Sant'Ermite - Riprofilatura di contenimento di una siepe sita sull'argine del T. Segno in Loc. San'Ermite a margine di Via Lazio, sia lato torrent ... eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura.	---	1,00	1,00	2'765,000	---	2'765,00			
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	395,000	---	395,00	395,00		
19 A.P.C.016	Rio delle Giue - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²	1,00	1,00	---	2'765,000	2'765,00	2'765,00			
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	316,000	---	316,00	316,00		
20 A.P.C.017	Rio Rivassa - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²	---	1,00	1,00	2'212,000	2'212,00	2'212,00			
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	316,000	---	316,00	316,00		
21 A.P.C.018	Rio Barrè - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²	---	1,00	1,00	316,000	---	316,00	316,00		
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	316,000	---	316,00	316,00		
22 A.P.C.019	Rio Ca Lotta - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²	1,00	1,00	---	2'212,000	2'212,00	2'212,00			
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	316,000	---	316,00	316,00		
	A R I P O R T A R E							14'897,10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							14'897,10		
23 A.P.C.020	Compluvio Via N. Bixio (Loc. Segno) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  Sommano a corpo	---	1,00	1,00	79,000	---	79,00	79,00		
24 A.P.C.021	Compluvio Via B. Peluffo (Loc. Segno) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  Sommano a corpo	---	1,00	1,00	395,000	---	395,00	395,00		
25 A.P.C.022	Rio località Navarrè (Via Nà Torre) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  Sommano a corpo	---	1,00	1,00	395,000	---	395,00	395,00		
26 A.P.C.023	Rio Calcinara - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  Sommano a corpo	---	1,00	1,00	1'817,000	---	1'817,00	1'817,00		
27 A.P.C.024	Compluvio Via Montegrappa 4 (Loc. San Genesio) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  Sommano a corpo	---	1,00	1,00	316,000	---	316,00	316,00		
28 A.P.C.025	Rio Canaa (Via Contrada) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  Sommano a corpo	---	1,00	1,00	553,000	---	553,00	553,00		
29 A.P.C.027	Torrente Quiliano - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100 m²  Sommano a corpo	---	1,00	1,00	2'133,000	---	2'133,00	2'133,00		
30 A.P.C.029	Rio San Nicolò (Loc. Porto Vado) - Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre									
	A R I P O R T A R E							20'585,10		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>					
	a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)					
	A misura euro	2'379,60	12'053,10	9'673,50		406,518
	A corpo euro	67'703,00	76'472,00	8'769,00		12,952
	In economia euro	0,00	0,00			
	Sommano euro	70'082,60	88'525,10	18'442,50		26,315
	b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza					
	A misura euro	0,00	0,00			
	A corpo euro	1'387,32	1'387,32			
	In economia euro	0,00	0,00			
	Sommano euro	1'387,32	1'387,32			
	Totale a base di appalto euro	71'469,92	89'912,42	18'442,50		25,805
	c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
	c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro	0,00	0,00			
	c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	0,00	0,00			
	c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00	0,00			
	c4) Imprevisti e arrotondamento euro	22'969,71	0,00		22'969,71	-100,000
	c5) Acquisizione aree o immobili euro	0,00	0,00			
	c6) Contribuzione a favore ANAC euro	35,00	35,00			
	c7) Accantonamento di cui al d.lgs. 36/2023, art. 45 euro	1'801,99	2'268,91	466,92		25,911
	c8) Spese per assicurazione dipendenti (progetista e verificatore) euro	0,00	0,00			
	c9) Spese per attività di consulenza o di supporto euro	0,00	0,00			
	c10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	0,00	0,00			
	c11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	0,00	0,00			
	c12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	0,00	0,00			
	c13) IVA ed eventuali altre imposte euro	15'723,38	19'780,73	4'057,35		25,805
	Sommano euro	40'530,08	22'084,64		18'445,44	-45,510
	TOTALE euro	112'000,00	111'997,06		2,94	-0,003
	Vado Ligure, 21/11/2025					
	<b>Il Tecnico</b> Geom. Alessandro Botta					
	A R I P O R T A R E					





## COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI**

### **Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2025.**

#### **Modifica del contratto**

(D.Lgs. 36/2023, articolo 120, comma 1, lettera a)

Oggetto: **Atto di sottomissione**

Progettista: Geom. Alessandro Botta	Revisioni:		
Collaboratori: Geom. Davide Figoni	n.	Data	Oggetto
	0	21/11/2025	Emissione
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Felice Rocca			Numero elaborato:  <b>6</b>
File:			

## Premesse

Con determinazione n° 509 del 05/09/2025 RG n° 1808 è stata disposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico **SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORIELLI**, Via Carpenaro 15A MIOGLIA (SV) - C.F./P.IVA 01174200095, con un ribasso del 21,00% sull'importo a base di appalto.

Il disciplinare di gara prevede all'articolo 1.4.13 la seguente clausola: "L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dell'appalto, secondo quanto previsto dal Codice, articolo 120, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale.

In particolare il contratto potrà essere modificato in diminuzione senza limiti di valore monetario nel rispetto di quanto previsto dal Codice, articolo 120, comma 1, lettera a).

L'amministrazione si riserva inoltre di far eseguire maggiori interventi fino alla concorrenza dell'intero importo a base di gara, estendendo anche ai lavori aggiuntivi il medesimo ribasso offerto in sede di gara."

Il presente progetto di modifica del contratto prevede di realizzare gli interventi già individuati come possibili in fase progettuale, in quanto volti a incrementare la sicurezza del territorio.

Durante il corso dei lavori si sono verificati forti eventi temporaleschi che hanno determinato un accumulo di tronchi e ramaglie nel tratto terminale del Torrente Quiliano la cui rimozione è stata valutata e quantificata nella presente modifica del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, con il presente atto si conviene quanto segue:

## ART. 1

Il Sig. Matteo Tortarolo, in qualità di legale rappresentante della **SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORIELLI**, Via Carpenaro 15A MIOGLIA (SV) - C.F./P.IVA 01174200095, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia redatta dal direttore dei lavori Geom. Alessandro Botta in data 21/11/2025 secondo gli elaborati allegati e consistenti:

- ❖ 01 Relazione illustrativa
- ❖ 02 Planimetrie su base CTR
- ❖ 03 Elenco prezzi - prezzi di contratto
- ❖ 04 Computo metrico estimativo – prezzi di contratto
- ❖ 05 Quadro comparativo
- ❖ 06 Atto di sottomissione

secondo gli stessi patti e condizioni dell'aggiudicazione indicata in premessa ed agli stessi prezzi offerti dall'operatore economico in data 03/09/2025.

## ART. 2

Il quadro economico del contratto originario è il seguente:

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	CONTRATTO	
Per lavori a misura	€ 3.012,00	

Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2025. Atto di sottomissione

Per lavori a corpo	€ 85.700,00	
Sommano		€ 88.712,00
A dedurre il ribasso d'asta del 21,00%	€ 18.629,40	
Restano		€ 70082,60
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A corpo	€ 1387,32	
Sommano		€ 1.387,32
Importo contrattuale netto		€ 71.469,92
c) Somme a disposizione della stazione appaltante		
Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 1.801,99	
IVA ed altre eventuali imposte	€ 15723,38	
Contribuzione ANAC	€ 35,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 22969,71	
Sommano		€ 40.530,08
Importo complessivo dell'intervento		€ 112.000,00

### ART. 3

L'importo per lavori del presente atto, derivante dall'applicazione dei prezzi offerti in fase di gara, risulta pari ad € 18.442,50 oltre € 4.057,35 per IVA al 22% così per complessivi **€ 22.499,85**, come di seguito specificato:

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni		
Per lavori a misura	€ 12.246,00	
Per lavori a corpo	€ 11.100,00	
Sommano		€ 23.346,00
A dedurre il ribasso d'asta del 21,000% (con applicazione dei prezzi offerti senza ribasso sulla manodopera)	€ 4.903,50	
Restano		€ 18.442,50
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 0,00	
Sommano		€ 0,00
<b>Importo contrattuale netto</b>		<b>€ 18.442,50</b>
c) Somme a disposizione della stazione appaltante		
Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 466,92	
IVA ed altre eventuali imposte	€ 4.057,35	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00	
Sommano		€ 4.524,27
<b>Importo complessivo dell'intervento</b>		<b>€ 22.966,77</b>

#### ART. 4

Il quadro economico complessivo dell'intervento viene pertanto riscritto come segue:

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	MAGGIORI LAVORI	
Per lavori a misura	€ 15.258,00	
Per lavori a corpo	€ 96.800,00	
Sommano		€ 112.058,00
A dedurre il ribasso d'asta del 21,00%	€ 23.532,90	
Restano		€ 88.525,10
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A corpo	€ 1.387,32	
Sommano		€ 1.387,32
Importo contrattuale netto		€ 89.912,42
c) Somme a disposizione della stazione appaltante		
Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 2.268,91	
IVA ed altre eventuali imposte	€ 19.780,73	
Contribuzione ANAC	€ 35,00	
Eventuali maggiori lavori ordinabili come previsto dal capitolato speciale di appalto, par. 1.1.2 (incluso incremento accantonamento decreto legislativo 50/2016, articolo 113 ed IVA)	€ 0,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2,94	
Sommano		€ 22.087,58
Importo complessivo dell'intervento		€ 112.000,00

#### ART. 5

Si conviene una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi al termine per l'ultimazione dei lavori.

Vado ligure, lì 21 novembre 2025

Il legale rappresentante  
**Sig. Matteo Tortarolo**  
 Coop. Vado L. S.r.l.  
 Via C. C. C. 15A  
 17020 MIOGLIA (SV)  
 Part. Iva 0117420095



Il Direttore dei Lavori  
**Geom. Alessandro Botta**
